

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO **DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2018**, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO Y EL CONTRATISTA **CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.** CUYO OBJETO ES **"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA, FRENTE 2"**.

LUGAR, HORA Y FECHA: SIENDO LAS 10:00 DEL **JUEVES, 17 DE ENERO DE 2019** EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN AV. PARRES ARIAS S/N, CALLE INT. ING. HUGO VÁZQUEZ REYES, BODEGA 9, COL. PARQUE INDUSTRIAL LOS BELENES, ZAPOPAN, JALISCO. SE REUNIERON EL **ING. GUILLERMO JOEL QUINTERO PADILLA** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA, Y DE JEFE DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE COPPLADEMUN, TODOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO Y EL C. **EDGAR ALBERTO CONTRERAS CARDENAS**; EN SU CARÁCTER DE **APODERADO LEGAL** DE LA EMPRESA DENOMINADA **CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.** PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

**DILIGENCIA:** EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 224 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO; EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, POR CONDUCTO DE LA JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA LEVANTA EL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, DEL CONTRATO DE **"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA, FRENTE 2."** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CUYO OBJETO ES EL SEÑALADO EN EL PROEMIO EFECTUADOS AL AMPARO DEL CONTRATO N° **DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2018** FIRMADO POR UN MONTO DE \$ 1, 587,699.35 (UN MILLÓN, QUINIENTOS OCHENTA Y SIETEMIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, LOS TRABAJOS SON ENTREGADOS POR LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.** CON EL IMPORTE DE \$ 1, 587,699.35 (UN MILLÓN, QUINIENTOS OCHENTA Y SIETEMIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL **15 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** Y UNA DURACIÓN DE **47 (CUARENTA Y SIETE)** DÍAS NATURALES. LAS FECHAS REALES DE INICIO Y TÉRMINO DE ESTE PLAZO SON DEL **15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018** Y UNA DURACIÓN DE **43 (CUARENTA Y TRES)** DÍAS NATURALES.

EL CONTROL DE LOS TRABAJOS ESTUVO A CARGO DEL RESIDENTE DE OBRA, **ING. GUILLERMO JOEL QUINTERO PADILLA**.

ANTICIPO.- SE OTORGÓ 0 % ANTICIPO

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| ANTICIPO RECIBIDO       | \$ 0.00 M.N. (CERO PESOS 00/100 M.N.) |
| MONTO AMORTIZADO        | \$ 0.00 M.N. (CERO PESOS 00/100 M.N.) |
| PENDIENTE POR AMORTIZAR | \$ 0.00 M.N. (CERO PESOS 00/100 M.N.) |

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO **DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2018**, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO Y EL CONTRATISTA **CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.** CUYO OBJETO ES **"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA, FRENTE 2"**.

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES DEFINITIVAS:

| ESTIMACIÓN         | FORMA DE EJECUCIÓN                                       | MONTO                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (UNO)            | DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | \$ 1, 174,897.52 (UN MILLÓN, CIENTO SETENTA Y CUATROMIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.)    |
| 2F (DOS FINIQUITO) | DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 | \$ 412,801.82 (CUATROCIENTOS DOCEMIL, OCHOCIENTOS Y UN PESOS 82/100 M.N.)                                  |
|                    | TOTAL EJERCIDO:                                          | \$ 1, 587,699.35 (UN MILLÓN, QUINIENTOS OCHENTA Y SIETEMIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.) |

SE ANEXA FINIQUITO DESGLOSADO POR CONCEPTOS.

CON RELACIÓN AL IMPORTE CONTRACTUAL MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA RESULTA UN SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR LO QUE LA CONTRATISTA RENUNCIA A DICHO PAGO.

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES:**

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EXCAVACIÓN PARA LÍNEA PRINCIPAL POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -5.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PLANTILLA CON ARENA AMARILLA (85% PSVM) PARA APOYO DE TUBERÍAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MEDIDO COMPACTADO.

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO **DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2018**, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO Y EL CONTRATISTA **CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.** CUYO OBJETO ES **"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA, FRENTE 2"**.

---

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DIÁMETRO DE 12" SERIE 20, INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA.

RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON ARENA AMARILLA, COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. (90% PSVM) INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.

RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.

CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).

ACARREO EN CAMIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00)

EXCAVACIÓN PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DIÁMETRO DE 6" SERIE 25, INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC DE 45°X 6" HIDRÁULICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA PVC DE 12"X 6" SANITARIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

REGISTRO FORJADO DE 40 X 40 Y DE 100 CM. DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, MUROS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM, COLOCADO A SOGA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, CON MARCO Y TAPA DE ÁNGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X.35MM DE ESPESOR Y DE CONCRETO F'C=150 KG/CM<sup>2</sup>. T.M.A. 19 MM., LOSA DE PISO DE 8 CM DE CONCRETO F'C=150KG/CM<sup>2</sup> HECHO EN OBRA Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO **DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2018**, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO Y EL CONTRATISTA **CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.** CUYO OBJETO ES **"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA, FRENTE 2"**.

---

ACARREO EN CAMIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00)

EXCAVACIÓN PARA POZO DE VISITA POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -5.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE  $F_y=4200$ , INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, ALAMBRON DEL #2 PARA ESTRIBOS @ 15 CMS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURO TIPO TEZÓN DE BLOCK TIPO PESADA DE 11X14X28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: MANIOBRAS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LOO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

APLANADO DE 2.50 CM. DE ESPESOR EN MURO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO O APALILLADO, INCLUYE: FESTEGRAL, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC DE 90°X 12" HIDRÁULICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC DE 12" HIDRÁULICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE P.V.C. DE 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 0.60 M. DE DIÁMETRO, PARA POZOS DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTA.

CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).

ACARREO EN CAMIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00)

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO **DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2018**, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO Y EL CONTRATISTA **CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.** CUYO OBJETO ES **"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA, FRENTE 2"**.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA UNIÓN DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2" DE BRONCE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

REPELLADO EN MUROS, DE 2.5 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.

DESPALME DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE CARGA MECÁNICA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.

**RELACIÓN DE OBLIGACIONES, LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.-**

| PARTIDA                                                                                                                                 | FECHA                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA, FRENTE 2." | DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2018 |


ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO *DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2018*, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO Y EL CONTRATISTA *CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.* CUYO OBJETO ES "*CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA, FRENTE 2*".

---


NOTA: SE ANEXA MEMORIA FOTOGRÁFICA.

---

OBRA:

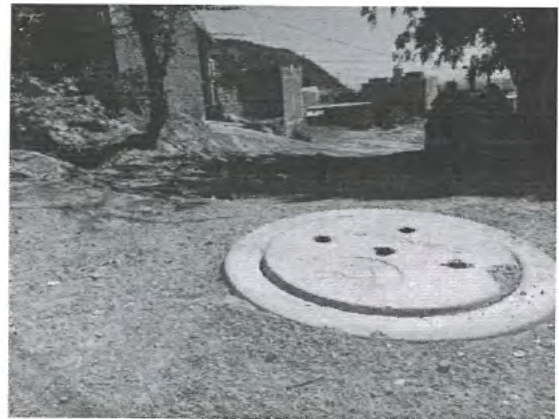

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO **DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2018**, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO Y EL CONTRATISTA **CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.** CUYO OBJETO ES **"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA, FRENTE 2"**.

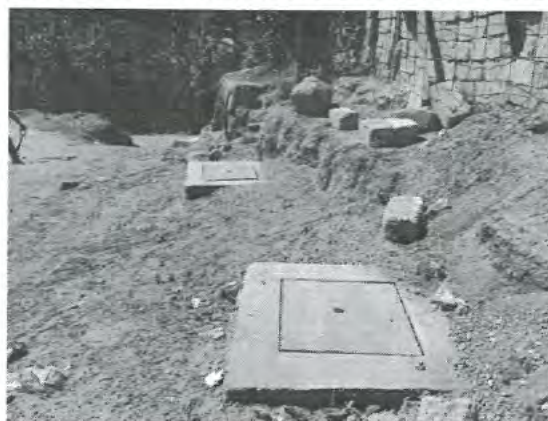

**GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS.-** PARA GARANTIZAR EL CONTRATO DE REFERENCIA POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE REFERENCIA, SE OTORGÓ LA FIANZA No. 1697591-0000 CON UN IMPORTE DE \$ 158,769.93 (CIENTO CINCUENTA Y OCHOMIL, SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.); I.V.A. INCLUIDO CON VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DEL 03 DE ENERO DE 2019 EXPEDIDA POR LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V., DE FECHA 03 DE ENERO DE 2019.

**MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES:** UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE ACTO EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS GARANTÍAS QUE SE CONTEMPLAN EN EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN III, Y 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN. LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL SEÑALAN LAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, MANIFESTANDO EL **C. EDGAR ALBERTO CONTRERAS CARDENAS** QUE SU REPRESENTADA **CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.** QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.



JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN  
ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS  
Y OBLIGACIONES



ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO **DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2018**, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO Y EL CONTRATISTA **CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.** CUYO OBJETO ES **"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA, FRENTE 2"**.

**CIERRE DEL ACTA.**- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.


NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

  
**ING. GUILLERMO JOEL QUINTERO PADILLA**  
JEFE DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE  
COPPLADEMUN

  
**ING. GUILLERMO JOEL QUINTERO PADILLA**  
RESIDENTE DE OBRA

POR " EL CONTRATISTA "

  
**CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.**  
**EDGAR ALBERTO CONTRERAS CARDENAS**  
APODERADO LEGAL

El principio es Zapopan
