



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura
Dirección de Construcción




SUPERVISOR: Ing. Fernando Adame Ternel

FECHA	N°
1 de julio de 2018	1

INFORMACIÓN GENERAL			
N° CONTRATO	DOPI-MUN-R33-ELE-LP-159-2018		FECHA DE INICIO
NOMBRE DE LA OBRA	RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JARDINES DE LOS ALAMOS MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO		FECHA DE TERMINO
			AVANCE FISICO % 100 AVANCE FINANCIERO 71.26 %
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ S.A. DE C.V.		PRORROGA RECIENTE
MONTO	\$1,396,209.12		ORIG. RECURSO
			R33

REPORTES Y/O OBSERVACIONES

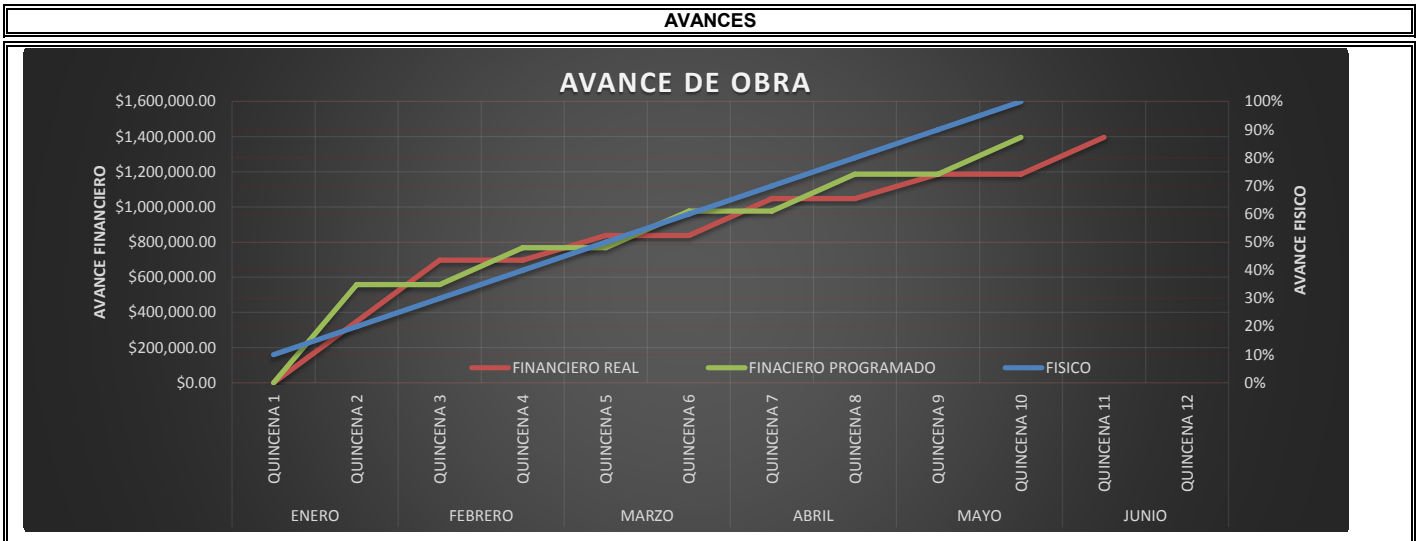



CROQUIS UBICACIÓN DE PROYECTO Y AVANCE





ESTIMACIONES

DOCUMENTO	N° FACTURA	FECHA	IMPORTE	IVA	TOTAL	AMORTI.	RET. 0.005	TOTAL FAC.	ACUMULADO	SALDO
ANTICIPO										
EST 1	1		\$667,443.57	\$106,790.97	\$774,234.54			\$774,234.54		\$621,974.58
EST 2	2		\$71,929.25	\$11,508.68	\$83,437.93			\$83,437.93		\$538,536.65
EST 3	3									
Σ =			\$739,372.82	\$118,299.65	\$857,672.47			\$857,672.47		\$538,536.65
