



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021**

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutos del día 29 veintinueve de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, en el sitio que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicado en Prolongación Laureles No. 300, colonia Tepeyac, Zapopan, Jal. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), se reunieron los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la **Décima Quinta** sesión del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz da inicio formal a la presente sesión de Comité Mixto (Décima Quinta Sesión).

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia.
2. Verificación de Quórum.
3. Aprobación de la Orden del Día.
4. Autorización de Inicio de Procedimiento de Licitación Pública, recurso Municipal.
5. Autorización de Inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, Recurso Municipal.
6. Presentación y autorización de convenios.
7. Autorización para la reclasificación de erogación de recurso de Crédito Banobras a Municipal.
8. Informe de Adjudicaciones Directas de atención inmediata en respuesta a la Declaratoria de Emergencia, con Recurso Municipal.
9. Lectura y aprobación del acta de la décima cuarta sesión del Comité Mixto de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco 2021.
10. Informe de Adjudicaciones Directas y sus avances físicos.
11. Asuntos varios.

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:



COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021

1. Lista de asistencia.

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **Presente.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **Presente.**

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **Presente.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **Presente.**

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **Presente.**

Regidor José Hiram Torres Salcedo, Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Ausente.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. **Presente.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **Presente.**


Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **Presente.**

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **Ausente.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Presente.**

2. Verificación del quórum legal para sesionar.

Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto de la orden del día.



COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021

3. Aprobación de la Orden del Día.

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. **A favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **A favor.**

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobada por unanimidad la Orden del Día.

4. Autorización de Inicio de Procedimiento de Licitación Pública, Recurso Municipal.

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el Tercer punto de la orden del día. Pasamos al Cuarto punto de la orden del día que es la **Autorización de Inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública, Recurso Municipal.** También se les hizo llegar previamente, cedo la voz al Secretario Técnico:



COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, da lectura y explicación de los contratos para la **Autorización de inicios de Procedimientos mediante la modalidad de Licitación Pública**, como se describen en la siguiente tabla:

Recurso Municipal

OBJETO DE OBRA	CONTRATO
Pavimentación y construcción de ciclovía en Av. Las Torres, sustitución de redes y obra complementaria, Municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 3.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-098-2021
Pavimentación y construcción de ciclovía en Av. Las Torres, sustitución de redes y obra complementaria, Municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 4.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-099-2021

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal, hace uso de la voz mencionando: Referente a los inicios de procedimiento de concursos que se presentan, la solicitud por parte de la Tesorería es que las obras estén física y financieramente terminadas antes de finalizar el ejercicio fiscal, derivado de las observaciones que nos han hecho la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, para evitar un subejercicio.

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Gracias.

Una vez dado lectura a las obras para inicio del proceso de contratación, y no teniendo ninguna observación de la misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. **A favor.**



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención lo presentado en el Cuarto punto de la Orden del Día que es la Autorización de inicio de Procedimientos mediante la modalidad de Licitación Pública.

5. Autorización de Inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, Recurso Municipal.

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el Cuarto punto de la Orden del Día. Pasamos al punto Quinto de la orden del día que es la Autorización de inicios de Procedimientos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con Recurso Municipal, pido al Secretario de lectura de los mismos:

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, da lectura y explicación de los contratos para la Autorización de inicios de Procedimientos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con Recurso Municipal, como se describen en la siguiente tabla:

Recurso Municipal.

OBJETO DE OBRA	CONTRATO
Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Inglaterra, incluye obras inducidas y obra complementaria, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-093-2021
Primera etapa de la Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario Vista Hermosa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-CI-095-2021
Construcción de sistema de riego, forestación y obra complementaria en el Parque de los Niños y las Niñas, en la colonia Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco, Etapa 2.	DOPI-MUN-RM-IH-CI-096-2021

Una vez dado lectura a las obras para inicio del proceso de contratación, y no teniendo ninguna observación de la misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021**

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. **A favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención lo presentado en el Quinto punto de la Orden del Día que es la Autorización de inicio de Procedimientos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con Recurso Municipal.

6. Presentación y autorización de convenios.

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogo el **Quinto** punto de la Orden del Día. Pasamos al punto **Sexto** que es la **Presentación y autorización de Convenios**, para lo cual pido al Secretario técnico de lectura de los mismos.

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación a los siguientes **convenios**:



COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021

Recuso Municipal.

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-MUN-RM-EP-CI-037-2021	Obra exterior y complementaria en las nuevas instalaciones de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$9,913,534.01	\$2,913,852.15	\$12,827,386.16	29.39

Justificación: De acuerdo al proyecto, del edificio de Mejoramiento Urbano en primer instancia éste se ejecutará en el área que actualmente es el estacionamiento de medio ambiente, por lo cual se tendrá que reubicar requiriendo trabajos en terracerías, asfalto y balizamiento del mismo; A su vez de acuerdo al análisis realizado para la construcción y distribución de los espacios el funcionamiento de esta dirección tiene Derivado al estudio de mecánica de suelos que se realizó en el cual el resultado arrojó que el tipo de material en el lugar es tipo III, incrementando los costos de las excavaciones realizadas.

Derivado de las observaciones por parte del área de maquinaria, en relación al proyecto se manifestó la necesidad de que durante el temporal de lluvias se requiere desazolvar el tramo H la zona del río Atemajac, generando cambios en los materiales de dicho tramo ya que se consideraba un caminamiento con resistencia al tránsito peatonal, modificándose a una resistencia para soportar la maquinaria que realizara los trabajos, por lo cual se ejecutaran trabajos no contemplados dentro del catálogo, como: concreto MR 45, fluido como base, mejoramiento del terreno existente; Adicional se realizaron muros de block, cadenas y castillos ya que el nivel existente estaba por debajo al que se marcaba en el plano y poder contener el material del lugar así como los rellenos de material de banco, solicitando precios extraordinarios, esto tendrá que reflejarse en un incremento del contrato por lo tanto se solicita convenio adicional.

De acuerdo a la cantidad de vehículos operativos que tiene a resguardo la dirección de Movimiento Urbano, fue propuesto que cumpliera con una adecuada disposición, así como la capacidad de albergar el parque vehicular adecuado para la atención a la ciudadanía concentrándolo en un solo sitio, el cual permite que la logística de operación sea más eficiente.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 29.39% del presupuesto original.

Recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, FAISM.

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-MUN-R33-DS-CI-022-2021	Construcción de redes complementarias de drenaje sanitario en la Col. Mesa Colorada Poniente, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$4,025,205.31	\$468,504.12	\$4,493,709.43	11.64



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021**

Justificación: Durante el proceso constructivo de la obra, se tuvo la necesidad de hacer una revisión a detalle del proyecto y en conjunto con la empresa contratista asignada para la ejecución de la obra, en el cual se observó la necesidad de integrar al contrato obras complementarias a la conexión con la línea principal de SIAPA por solicitud de la misma dependencia y hacer de la obra en ejecución lo más funcional posible, estos trabajos requieren realizar demoliciones de losa de concreto, banquetas, pozos, caídas adosadas por nombrar algunos, estos conceptos como los de mayor necesidad y así de esta manera garantizar la factibilidad y correcto funcionamiento de esta obra en ejecución.

Después de realizada dicha revisión se solicitó agregar varios conceptos que no están dentro del catálogo de la obra.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 11.64% del presupuesto original.

Recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, FAISM.

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-026-2021	Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de infraestructura hidráulica y sanitaria en calle Oro y construcción de banquetas en calle Roca, Col. Balcones de la Cantera, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$4,479,159.30	\$523,049.80	\$5,002,209.10	11.68

Justificación: Durante el proceso constructivo de la obra, se tuvo la necesidad de hacer una revisión a detalle del proyecto y en conjunto con la empresa contratista asignada para la ejecución de la obra, en el cual se observó la necesidad de integrar al contrato el concepto de Alumbrado Público en el tramo correspondiente a la nueva vialidad, debido al alto índice de delincuencia, además de ser ruta principal para paso de transporte urbano y de esta manera garantizar la seguridad de las personas que transitan por estas calles en horario nocturno, con esta inclusión de alumbrado público se está brindando la seguridad al peatón y vecinos de esta zona, estos conceptos como los de mayor necesidad y así de esta manera garantizar la factibilidad y correcto funcionamiento de esta obra en ejecución.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 11.68% del presupuesto original.



COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021

Recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, FAISM.

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-011-2021	Pavimentación con empedrado tradicional y huellas de rodamiento en calle Los Belenes y calle Encino, Col. Anexo Jardines del Vergel, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$1,923,864.87	\$724,765.63	\$2'648,630.50	37.67

Justificación: Durante la ejecución de los trabajos para la pavimentación con empedrado tradicional y huellas de rodamiento en calle Los belenes y calle Encino, se realizó la revisión de las líneas de agua potable y drenaje en conjunto con personal de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para determinar el estado de dichas líneas, ya que no fue considerada en proyecto y presupuesto de obra la sustitución de las mismas.

Derivado de la revisión se encontró que la línea de agua potable y drenaje estaba en aparente buen estado, sin embargo solicitó el personal de SIAPA realizar un sondeo en la línea de drenaje ya que no se tiene registro de algún cambio realizado anteriormente en periodo cercano.

Al realizar el sondeo de la línea se encontró con tubo corrugado en mal estado a lo largo de toda la línea principal de drenaje, por lo que resulta necesaria la sustitución de la tubería para garantizar el correcto funcionamiento de la línea durante el periodo de vida útil para el cual está proyectada la pavimentación.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 37.67 % del presupuesto original.

Recurso Municipal CUSMAX

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-LP-005-2020	Peatonalización, construcción de banquetas, guarniciones, bolardos y accesibilidad universal en la zona Norte del Municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 1.	\$4,892,906.69	\$405,328.42	\$5,298,235.11	8.28

Justificación: Derivado de una ampliación de alcances y adecuaciones al proyecto se vio en la necesidad de realizar trabajos no planeados inicialmente.

Se realizaron banquetas y nos encontramos con el problema en una boca de tormenta la cual se encontraba contrapendiente a la red sanitaria, en el temporal de lluvias la red se saturaba y no permitía desaguar, el agua negra rebosaba por la boca de tormenta estancándose en el cruce peatonal.



COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 8.28% del presupuesto original.

Recurso Municipal CUSMAX

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-MUN-CUSMAX-IM-CI-054-2020	Construcción de gavetas en el panteón Altagracia, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$4,489,555.23	\$493,941.95	\$4,983,497.18	11.00

Justificación: Derivado del proceso de construcción de las gavetas solicitado por la dirección de cementerios se vio la necesidad de considerar impermeabilización de las mismas en su parte interna para garantizar la retención de posibles derrames de líquidos y filtraciones al subsuelo. En vista de lo expuesto se dictamina que es procedente la justificación.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 11 % del presupuesto original.

Recurso Municipal CUSMAX

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-130-2020	Construcción y equipamiento de la segunda etapa del parque Zapopan Central, en la colonia Tepeyac, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$16,131,634.51	\$4'032,908.63	\$20'164,543.14	25.00

Justificación: Durante el proceso constructivo de la obra se realizaron adecuaciones al proyecto en el entorno lúdico debido al destino de algunas áreas en Parque de las Niñas y los Niños, así como la incorporación de una fuente de proyecciones con equipamiento para la realización de trabajos en conjunto con algunos elementos independientes de parque central.



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021**

Se refuerza entorno lúdico, con la construcción de espacios para la convivencia familiar y ciudadanos en general, (equipamiento, juegos, mobiliario).

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 25% del presupuesto original.

Recurso Municipal CUSMAX

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-131-2020	Construcción y equipamiento de la segunda etapa del parque Zapopan Central, en la colonia Tepeyac, frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$17,338,884.87	\$4'759,897.43	\$22'908,782.30	27.45

Justificación: Durante la ejecución de la obra se realizaron algunas modificaciones al proyecto en el entorno lúdico. Por seguridad en los juegos interactivos, se dio la indicación por parte de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura que se realizaran adecuaciones en las zapatas de los juegos, para que tenga mayor anclaje y resistencia hacia el volteo ocasionado o natural y así no comprometer la seguridad del mismo.

Se refuerza entorno lúdico, con la construcción de espacios para la convivencia familiar y ciudadanos en general, (equipamiento, juegos, mobiliario).

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 27.45% del presupuesto original.

Recurso proveniente del Sistema DIF Zapopan

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-MUN-DIF-IM-CI-033-2021	Obra civil para la construcción, rehabilitación y equipamiento del Centro de Desarrollo Infantil N° 2, Pablo Casals, colonia Atemajac del Valle, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$10,113,445.33	\$1,157,713.28	\$ 11,271,158.61	11.45



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021**

Justificación: Derivado del recorrido de obra con la Directora del Sistema DIF municipal, se determinó ampliar las metas del contrato en mención, para incluir diversos trabajos, como lo son: la pintura en el área de la cancha deportiva, sumado a los trabajos solicitados de ventanería, incluyendo en estos alcances el desmontaje de diversos cristales, así como el suministro y colocación de cristal de 6 mm, con película de seguridad, suministro e instalación de diversos elementos como minisplits, interruptores de seguridad, bombas de condensados y drenes adicionales para equipos de aire acondicionado. También se consideraron trabajos de mantenimiento en el área de cocina y de carpintería en el aula virtual, sumada a los trabajos de pintura de esmalte en estructura metálica, pintura acrílica en superficies planas con acabado apallado y/o pulida y pintura de tráfico en banquetas interiores.

Recurso Estatal Financiamiento para Inversión Pública Productiva mediante el Decreto 27913/LXII/20 autorizado por el H. Congreso del Estado de Jalisco.

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-EST-RE-PAV-LP-041-2021	Rehabilitación con concreto hidráulico del corredor Ávila Camacho - Laureles - Juan Pablo II - Juan Gil Preciado (Lado Norte), Incluye: sustitución de red de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, banquetas, alumbrado público y complementos, frente 1, municipio de Zapopan Jalisco. Tramo 3	\$10,425,008.88	\$825,030.33	\$11'250,039.21	7.91

Justificación: Durante la ejecución de la obra se realizaron algunas modificaciones al proyecto original entre los cuales destaca los trabajos relacionados en la desincorporación y la incorporación a carriles centrales los cuales se encontraban en muy malas condiciones, y no tenían la configuración requerida para el buen funcionamiento de la vialidad.

Aunado a esto se integró una ciclovia con color rojo terracota integrado al 4% la cual no estaba contemplada en proyecto inicial la cual fue propuesta por la Dirección de Movilidad de Zapopan, también se integraron los elementos delimitantes entre la losa de rodamiento y la losa de la ciclovia las cuales se contemplan las llamadas "flautas" por tener mayor resistencia que otros elementos delimitantes. Esta ciclovia permitirá la conexión entre la ciclovia proveniente de la lateral de Juan Pablo II, y la ciclovia proveniente de la lateral de Anillo Periférico Poniente Manuel Gómez Morín.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 7.91% del presupuesto original.



COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021

Recurso Estatal Financiamiento para Inversión Pública Productiva mediante el Decreto 27913/LXII/20 autorizado por el H. Congreso del Estado de Jalisco.

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-EST-RE-PAV-LP-042-2021	Rehabilitación con concreto hidráulico del corredor Ávila Camacho - Laureles - Juan Pablo II - Juan Gil Preciado (Lado Norte), incluye: sustitución de red de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, banquetas, alumbrado público y complementos, frente 1, municipio de Zapopan Jalisco. Tramo 4.	\$11,502,492.52	\$2,414,277.72	\$13,916,770.24	20.99

Justificación: Durante la ejecución de la obra se realizaron algunas modificaciones al proyecto original entre los cuales destaca los trabajos relacionados en la conexión con palería de la línea de 14" así como los servicios de cada edificio adyacente a la vialidad los cuales se encontraban en muy malas condiciones, por petición del SIAPA se solicitó realizar cajas de válvulas en frente de cada edificio para su óptima operación así como un pozo de visita sirviendo como descarga sanitaria debido a los diámetros existentes en cada edificio.

Aunado a esto se integró una ciclovia con color rojo terracota integrado al 4% la cual no estaba contemplada en proyecto inicial la cual fue propuesta por la Dirección de Movilidad de Zapopan, también se integraron los elementos delimitantes entre la losa de rodamiento y la losa de la ciclovia las cuales se contemplan las llamadas "flautas" por tener mayor resistencia que otros elementos delimitantes.

Esta ciclovia permitirá la conexión entre la ciclovia proveniente de la lateral de Juan Pablo 11, y la ciclovia proveniente de la lateral de Anillo Periférico Poniente Manuel Gómez Morín.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 20.99% del presupuesto original.



COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021

Recurso Estatal Financiamiento para Inversión Pública Productiva mediante el Decreto 27913/LXII/20 autorizado por el H. Congreso del Estado de Jalisco.

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-EST-RE-PAV-LP-043-2021	Rehabilitación con concreto hidráulico del corredor Ávila Camacho - Laureles - Juan Pablo II - Juan Gil Preciado (Lado Sur), incluye: sustitución de red de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, banquetas, alumbrado público y complementos, frente 1, municipio de Zapopan Jalisco. Tramo 3	\$4,013,844.93	\$1,179,088.83	\$5,192,933.76	29.38

Justificación: Durante la ejecución de la obra se realizaron algunas modificaciones al proyecto entre los cuales destacan pavimentación del cruce Av. Arcos del Triunfo.

Por la Lateral de Av. Juan Gil Preciado en "sentido sur" de dirección Anillo Periférico Poniente Manuel Gómez Morín, donde se ubica el cruce Av. Arcos del Triunfo el cual se encuentra en muy malas condiciones, así como los desniveles que este presenta, los cuales provocan la acumulación de tránsito y accidentes en la zona.

Aunado a esto se realizara la construcción de las banquetas para conectar el tramo de la estación Arcos de Zapopan con la lateral de Anillo Periférico Poniente Manuel Gómez Morín.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 29.38% del presupuesto original.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana, hace uso de la voz mencionando: Queremos señalar en relación a los convenios en su totalidad rebasan el periodo contractual por lo que solicitamos a la autoridad ejecutora que esta autorización se encuentre dentro de los periodos contractuales de los contratos.

Una vez dado lectura y explicación a los contratos para la autorización de convenios, y no teniendo ninguna observación de la misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. **A favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención lo presentado en el punto Sexto de la Orden del Día que es la Autorización de Convenios a los Contratos.

7. Autorización para la reclasificación de erogación de recurso de Crédito Banobras a Municipal.

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogo el **Sexto** punto de la Orden del Día. Pasamos al siguiente punto **Séptimo** que es la **Autorización para la reclasificación de erogación de recurso de Crédito Banobras a Municipal**, para lo cual pido al Secretario técnico de lectura del mismo.

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación a la **autorización para la reclasificación de erogación de recurso de Crédito Banobras a Municipal** del siguiente contrato:

CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE A RECLASIFICAR
DOPI-MUN-CR-IR-CI-031-2021	Estructuras y Edificaciones Cobel, S.A. de C.V.	\$1'148,982.70

Una vez dado lectura y explicación al contrato para la autorización de reclasificar la erogación de recurso de Crédito Banobras a Municipal, y no teniendo ninguna observación de la misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera.



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021**

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública **A favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. **A favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención lo presentado en el punto Séptimo de la Orden del Día que es la autorización para la reclasificación de erogación de recurso de Crédito Banobras a Municipal.

8. Informe de Adjudicaciones Directas de atención inmediata en respuesta a la Declaratoria de Emergencia, con Recurso Municipal.

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el **Séptimo** punto de la Orden del Día, pasamos al punto **Octavo** que es el Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa de atención inmediata en respuesta a la Declaratoria de Emergencia, con Recurso Municipal, pido al Secretario de lectura de los mismos:



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021**

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Con el objeto de atender la contingencia señalada en la DECLARATORIA DE EMERGENCIA el Comité Municipal de Emergencia, emitida con fecha 26 de Julio de 2021, "a consecuencia del fenómeno de origen natural de carácter hidrometeorológico lluvia severa, ocurrida el día 24 de julio del año en curso de las 16:54 a las 18:19 horas aproximadamente, provocando inundación pluvial y fluvial, acumulación de agua y lodo dentro de varias viviendas y en algunas vialidades, generando encharcamientos e inundaciones de consideración, afectaciones en infraestructura, inmuebles y pérdida de menaje" que "aconteció en: las colonias El Tizate, Colinas de la Primavera, Arenales Tapatíos, Miramar, Lomas de la Primavera, La Floresta del Collí, Carlos Rivera Aceves, Briseño, El Fortín, Mariano Otero, Brisas de la Primavera, Cantaluna, Campestre los Pinos, El Mante, Miramar Poniente, Paraísos del Collí, El Rehilete, Residencial San Nicolás, Valle de San Nicolás, Villas de la Primavera, así como las ubicadas en las inmediaciones del Arroyo El Grande y Teisquinque del Municipio de Zapopan, Jalisco", y efectuar las obras necesarias por parte por la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio de Zapopan, Jalisco.

Recurso Municipal.

OBJETO DE OBRA	NÚMERO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	IMPORTE ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO
Carga y retiro de desechos producto de arrastre en las colonias afectadas manifestadas en la declaratoria de emergencia, desde puntos de acopio a tiraderos autorizados atención inmediata, primera etapa, en el Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-CONT-AD-083-2021	Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.	\$3,910,904.93	100%
Desazolve de sistema de retención y control pluvial de Gavión #4, sobre Arroyo Seco, atención inmediata, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-CONT-AD-084-2021	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$7,825,458.36	30%
Desazolve de sistema de retención y control pluvial de Gavión #5, sobre Arroyo Teisquinque, atención inmediata, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-CONT-AD-085-2021	Xcan Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,869,458.56	80%
Desazolve y reforzamiento de sistema de retención y control pluvial de gavión #1, sobre Arroyo Seco, atención inmediata, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-CONT-AD-086-2021	Productos de Energía Verde, S.A. de C.V.	\$4'025,156.85	20%
Obras de emergencia para rehabilitación de muros de mampostería sobre Arroyo Seco, frente 1, atención inmediata, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-CONT-AD-087-2021	Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V.	\$6,187,589.57	60%



COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021

OBJETO DE OBRA	NÚMERO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	IMPORTE ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO
Obras de emergencia para rehabilitación de muros de mampostería sobre Arroyo Seco, frente 2, atención inmediata, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-CONT-AD-088-2021	Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.	\$5,102,458.85	50%
Obras de emergencia para reparación y construcción de muros de mampostería sobre el arroyo el Teisquinque; y construcción de paso vehicular, en la zona afectada por la declaratoria de emergencia, atención inmediata, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-CONT-AD-089-2021	Firma Ing GDL, S.A. de C.V.	\$1'528,456.78	80%
Obras de emergencia para reparación de canal y vaso regulador sobre el arroyo el Teisquinque, en la zona afectada por la declaratoria de emergencia, atención inmediata, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-CONT-AD-090-2021	Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.	\$4,879,856.28	40%

Una vez dada lectura y explicación al detalle de cada uno de los contratos para su autorización, y no teniendo ninguna observación de la misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. **A favor.**



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención lo presentado en el punto Octavo de la Orden del Día que es la Autorización de Adjudicaciones Directas mediante recurso municipal.

9. Lectura y aprobación del acta de la décima cuarta sesión del Comité Mixto de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco 2021.

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el **Octavo** punto de la orden del día. Pasamos al **Noveno** punto de la orden del día que es **Lectura y aprobación del acta de la décima cuarta sesión del Comité Mixto de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco 2021**. También se les hizo llegar previamente; si no tienen inconveniente dispensamos su lectura y si no tienen ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. **A favor.**



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención el acta décima cuarta sesión del Comité Mixto de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco 2021.

10. Informe de Adjudicaciones Directas y sus avances físicos.

La Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el **Noveno** punto de la Orden del Día, pasamos al punto **Décimo** que es el Informe de Adjudicaciones Directas y sus Avances Físicos, pido al Secretario de lectura de los mismos:

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de cada una de las obras en la modalidad de adjudicación directa, como se describe en la siguiente tabla:

Recurso Municipal.

OBJETO DE OBRA	NÚMERO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	IMPORTE ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO
Construcción de cancha de Béisbol en Parque de la colonia Tepeyac, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-ID-AD-097-2021	Inovaciones en Mobiliario Urbano. S.A. de C.V.	\$2,038,127.50	95%

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz hace uso de la voz mencionando: Si no hay observación al respecto, y como este es un informe no se vota, pasamos al siguiente punto.



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021**

11. Asuntos varios.

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el **Décimo** punto de la orden del día. Pasamos al punto **Décimo Primero** que es Asuntos Varios, si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes.

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz hace uso de la voz mencionando: agradezco la armonía, recepción y seguimiento que se me dio en estos últimos meses en este Comité de Obras Públicas al frente de la coordinación general de gestión integral de ciudad, misma que dependerá del presidente electo si continuo al frente. Agradezco al Director su seguimiento, a la Tesorería su siempre dispuesta participación y asesoría con la única finalidad de seguir avanzando en finanzas públicas sanas, en obras de buena calidad para los ciudadanos pero sobre todo en un cumplimiento irrestricto de lo que nos marca la normatividad tanto Estatal como Municipal para la fiscalización de los recursos porque al ser funcionarios públicos es nuestra principal obligación tener una transparencia y eficiencia en todos los procesos.

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, hace uso de la voz mencionando: aprovechar el momento para agradecer a los compañeros y compañeras de este Comité a los Colegios, Cámara, Regidores, Contraloría, Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad, al Director con quien llevo tres años trabajando junto con mis compañeras y compañeros, que todo ha sido en benéfico de nuestra ciudad Zapopan. Debemos sentirnos orgullosos porque colaboramos para construir una nueva ciudad, debemos seguir trabajando desde la trinchera que nos corresponda, en hora buena a seguir adelante.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano, hace uso de la voz mencionando: agradecer en primer término la apertura, la disposición al dialogo la búsqueda de consensos y acuerdos que en todo momento se dio al seno de este Comité, agradecer a cada una de las representaciones Colegios, Cámaras, Contraloría, a las diferentes fracciones que integran el ayuntamiento que están aquí representadas al Director y la Coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad, y desearles a quienes continúan en la próxima administración lo sigan haciendo con esta misma mística de trabajo para que Zapopan siga contando con infraestructura que permita a quienes aquí vivimos tener una mejor calidad de vida. A quienes no siguen en la administración que tengan éxito en las tareas proyectos que abran de emprender y que siempre se haga este trabajo institucional que siempre se hace en bien de la ciudadanía.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Titular del Partido Acción Nacional, hace uso de la voz mencionando: También agradecer la disposición, apertura el trabajo que se vino realizando en conjunto, tanto a usted Director como a la Directora y a todos los que participaron. Hoy Zapopan es diferente, Zapopan ha atendido muchas de las situaciones como hoy se vio el tema de contingencias, obras que eran necesarias para la ciudad. Nos llevamos un trabajo la satisfacción de haber cumplido la responsabilidad como regidores y estar presentes en cada una de las comisiones y comités; muchas gracias por todo.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: reforzando el tema del agradecimiento, Obras Públicas representa muchas personas muchos pensamientos, este comité es lo que nos ayuda a que vallamos todos en orden, por lo que les agradezco a todos; hoy en día Zapopan está considerado a nivel nacional el número uno en obra pública, el número uno en obra pública es la visualización que tiene la ciudadanía, y es una



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021**

ciudadanía generalizada con base en distintos censos que se generan y eso es gracias a la calidad de las obras en proyecto en ejecución y administración; gracias a todos y debemos seguir conservando esa línea, los que continuamos o no les deseamos el mayor éxito del mundo y siempre veamos hacia atrás con un dulce sabor de boca por lo realizado.

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco hace uso de la voz mencionando: si me permiten yo me quedo con la satisfacción de poner un granito de arena en esta labor y con la amistad de todos ustedes. Gracias.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Titular del Partido Acción Nacional, hace uso de la voz mencionando: si me permiten contrario a los agradecimientos el día de hoy tuvimos la sesión del pleno del ayuntamiento se aprobó por unanimidad de los que integramos el ayuntamiento el convenio modificadorio en el tema del presupuesto en cuestión del crédito, para que quede asentado en el acta para que se hagan todos los procedimientos administrativos y se pueda llevar a buen puerto todo el trabajo con todo lo que se aplicó este recurso en beneficio de la ciudadanía. Gracias.


Sin otro asunto que tratar la Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Patricia Fregoso Cruz, da por terminada la **Décima Quinta** sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la actual administración, siendo las **15:17** quince horas con diecisiete minutos del día **29 (veintinueve) de septiembre de 2021 (dos mil veintiuno)**, elaborándose la presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.

Lic. Patricia Fregoso Cruz
Presidente del Comité Mixto de Obra Pública.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña
Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano.



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021**




Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos


Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos



Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga
Suplente de la Tesorera Municipal.



Ing. Ismael Jáuregui Castañeda
Secretario del Comité Mixto de Obra Pública.




Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo
Representante Titular del Partido Acción Nacional.



Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos
Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano.



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA QUINTA SESIÓN, 2021**



Lic. William Gómez Hueso

Representante Suplente de la Fracción Independiente.




Arq. Rafael Barragán Maldonado

Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco.



Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos

Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

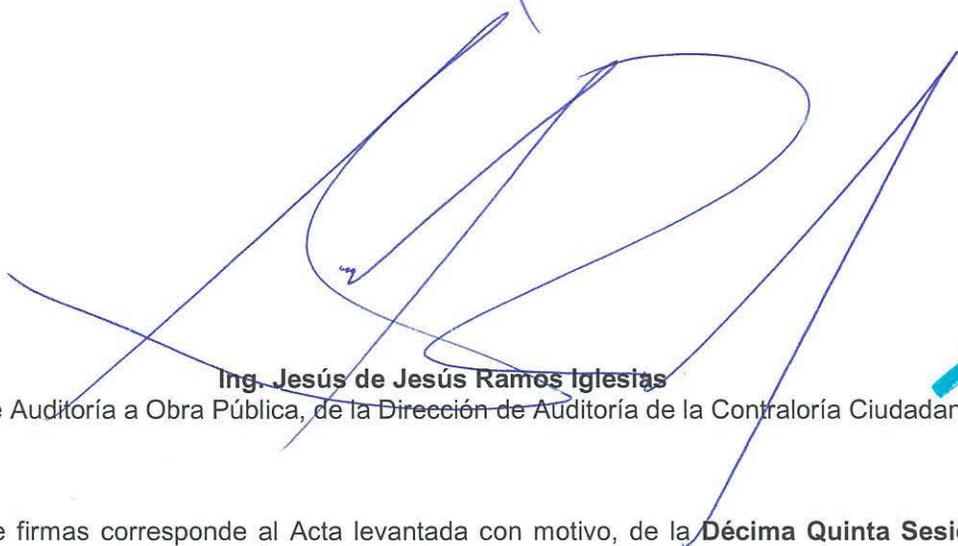

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias

Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la **Décima Quinta Sesión** del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración.
