



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura
Dirección de Construcción




SUPERVISOR: Arq. Jorge Adriel Guzmán Cervantes


FECHA	N°
10 de junio de 2019	1

INFORMACIÓN GENERAL			
N° CONTRATO	DOPI-MUN-RM-AP-AD-161-2018	FECHA DE INICIO	14 de mayo de 2018
NOMBRE DE LA OBRA	Construcción de bocas de tormenta y pozos de absorción en la Av. General Ramón Corona, en la zona de La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2.	FECHA DE TERMINO	30 de junio de 2018
		AVANCE FISICO 100%	AVANCE FINANCIERO 74%
CONTRATISTA	Aedificant, S.A. de C.V.	LOCALIDAD / COL.	Zapopan
MONTO	\$1,799,142.18	ORIG. RECURSO	MUN

REPORTE Y/U OBSERVACIONES
OBRA FISICAMENTE AL 100%

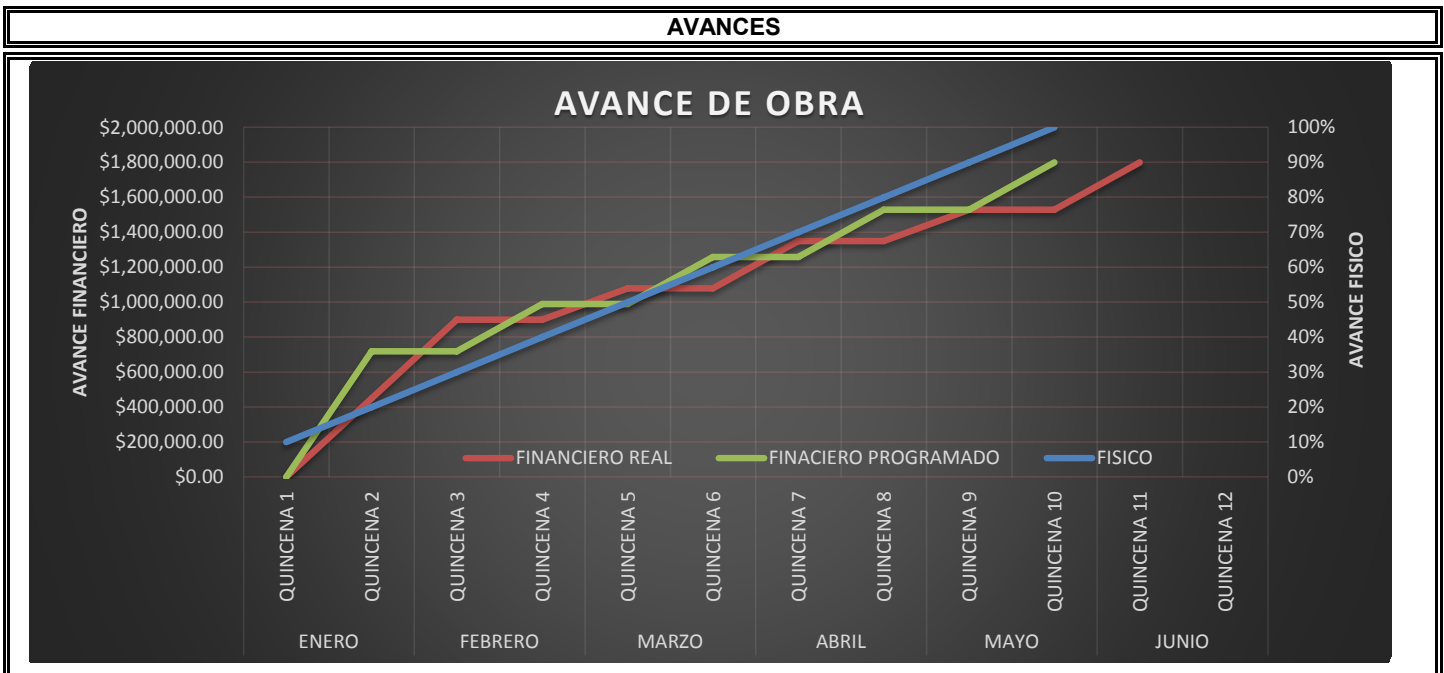

MEMORIA FOTOGRAFICA



CROQUIS UBICACIÓN DE PROYECTO Y AVANCE



ESTIMACIONES

DOCUMENTO	N° FACTURA	FECHA	IMPORTE	IVA	TOTAL	AMORTI.	RET. 0.005	TOTAL FAC.	ACUMULADO	SALDO
ANTICIPO	1									
EST 1	2	31/05/2018	\$1,147,728.63	\$183,636.58	\$1,331,365.21			\$1,331,365.21	\$1,331,365.21	\$467,776.97
EST 2	3								\$1,331,365.21	\$467,776.97
EST 3	4								\$1,331,365.21	\$467,776.97
EST 4	5									
EST 5	6									
Σ =			\$1,147,728.63	\$183,636.58	\$1,331,365.21			\$1,331,365.21		
