



**H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN**  
**Dirección de Obras Públicas e Infraestructura**  
**Dirección de Construcción**




**SUPERVISOR:** L.U.M.A. Juan José García Pérez


<b>FECHA</b>	<b>N°</b>
10 de junio de 2019	1

INFORMACIÓN GENERAL			
<b>N° CONTRATO</b>	DOPI-MUN-RM-ELE-AD-240-2018	<b>FECHA DE INICIO</b>	6 de agosto de 2018
<b>NOMBRE DE LA OBRA</b>	Red eléctrica para alumbrado en cancha de usos múltiples en la Escuela Secundaria Mixta 18, en la colonia Ciudad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco.	<b>FECHA DE TERMINO</b>	30 de agosto de 2018
		<b>AVANCE FISICO</b> 100%	<b>AVANCE FINANCIERO</b> 0%
<b>CONTRATISTA</b>	Constructora Micuet, S.A. de C.V.	<b>LOCALIDAD / COL.</b>	Zapopan
<b>MONTO</b>	\$40,494.47	<b>ORIG. RECURSO</b>	MUN

REPORTE Y/U OBSERVACIONES
OBRA FISICAMENTE AL 100%

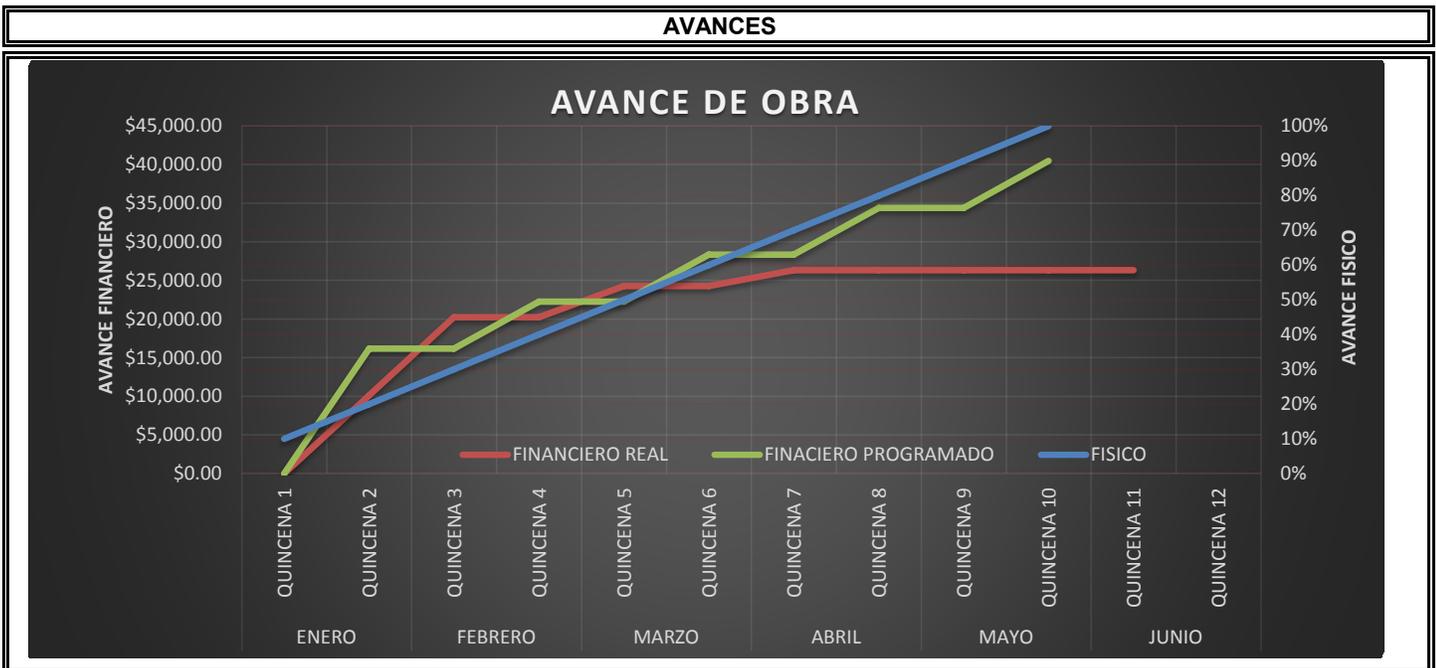

**MEMORIA FOTOGRAFICA**



**CROQUIS UBICACIÓN DE PROYECTO Y AVANCE**



**ESTIMACIONES**

DOCUMENTO	Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE	IVA	TOTAL	AMORTI.	RET. 0.005	TOTAL FAC.	ACUMULADO	SALDO
ANTICIPO	1									
EST 1	2									\$40.494.47
EST 2	3									\$40.494.47
EST 3	4									\$40.494.47
EST 4	5									
EST 5	6									
Σ =										
