

En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-RM-PAV-LP-083-2025, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: **Modernización a la Red de Vía Urbana Santa Ana Tepetitlán, frente 04, pavimentación de la Av. Dr. Mateo del Regil, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Villas Perisur, Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco.**

Habiéndose llevado a cabo el correspondiente acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la **Décima Tercera Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2025**, el día **08 de julio de 2025**, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de **19 (diecinueve)** licitantes; y llevándose a cabo, posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar “si cumple” o “no cumple” los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUCTORA C2A S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOPI-112, en el análisis no considera un tapón macho galvanizado de 1/2" para la elaboración del concepto.

Obra:	Modernización a la Red de Vía Urbana Santa Ana Tepetitlán, frente 04, pavimentación de la Av. Dr. Mateo del Regil, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Villas Perisur, Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-083-2025	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Fecha: 08/07/2025 Inicio obra: 01/08/2025 Fin obra: 30/11/2025 Duración: 122 días naturales
Lugar:	Zapopan, Jalisco	
CONSTRUCTORA C2A S.A. DE C.V.		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
--------	----------	--------	----------

Partida: 2 Análisis No.: 2

Análisis: **DOPI-112** **PZA 18.0000**

CUADRO DE MEDICIÓN PARA AGUA POTABLE EN TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: HERRAMIENTA, CODO DE BRONCE CON ENTRADA A POLIETILENO Y SALIDA A FIERRO GALVANIZADO CON SISTEMA A PRESIÓN DE 1/2", NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.50 M PROMEDIO), LLAVE DE PASO DE 1/2", NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.50 M PROMEDIO), TEE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2", TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 1/2", TEE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2", TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 1/2", NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.05 M PROMEDIO), CODO DE 90° GALVANIZADO DE 1/2", VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2", NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.40 M PROMEDIO), CONEXIONES, CORTES, NIVELACIÓN, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MATERIALES

1-124.1	CODO DE BRONCE CON ENTRADA A POLIETILENO Y SALIDA A FIERRO GALVANIZADO CON SISTEMA A PRESIÓN DE 1/2"	PZA	1.000000
1-124.3	LLAVE DE PASO DE 1/2"	PZA	1.000000
1-124.4	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.50 M PROMEDIO)	PZA	1.000000
1-124.5	TEE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2"	PZA	2.000000
1-124.6	VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 1/2"	PZA	1.000000
1-124.7	CODO DE 90° GALVANIZADO DE 1/2"	PZA	1.000000
M-MEN	MATERIALES MENORES	LOTE	0.300000
1-124.8	VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	PZA	1.000000
3-013.3	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.40 M PROMEDIO)	PZA	1.000000
3-013.2	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.05 M PROMEDIO)	PZA	2.000000
100052	TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 1/2"	PZA	1.000000

MANO DE OBRA

MO04	CUADRILLA NO. 04 (OF. TUBERO + 1 AYUDANTE)	JOR	0.290108
------	--	-----	----------

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MO01	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
------	-------------------	---	----------

Incumplimiento. – D). - La tarjeta del concepto DOPI-199, en el análisis no considera el poste de PTR galvanizado de 2" x 2" en los materiales para la elaboración del concepto.

Obra:	Modernización a la Red de Vía Urbana Santa Ana Tepetitlán, frente 04, pavimentación de la Av. Dr. Mateo del Regil, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Villas Perisur, Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-083-2025	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Fecha: 08/07/2025 Inicio obra: 01/08/2025 Fin obra: 30/11/2025 Duración: 122 días naturales
Lugar:	Zapopan, Jalisco	
CONSTRUCTORA C2A S.A. DE C.V.		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
--------	----------	--------	----------

Partida: 5 Análisis No.:
Análisis: DOPI-199 PZA 4.0000
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (RESTRICTIVO, INFORMATIVO O PREVENTIVO), CON DOS TABLEROS DE 0.61X0.61 M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON PELÍCULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, ADICIONAL UN TABLERO DE 0.61 X 0.20 M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON PELÍCULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, **POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2"X2"** Y CON ALTURA LIBRE DE MÍNIMO 2.50 M DESDE NIVEL DE SUELO A PARTE INFERIOR DEL TABLERO DE LA SENAL EN CALIBRE 12, DADO DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 40X40X80 CM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES			
1-214-1.1	SEÑALAMIENTO VERTICAL (RESTRICTIVO, INFORMATIVO O PREVENTIVO), CON DOS TABLEROS DE 0.61X0.61 M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON PELÍCULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, ADICIONAL UN TABLERO DE 0.61 X 0.20 M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON PELÍCULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD	PZA	1.000000

MANO DE OBRA
 MO05 CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE) JOR 0.194691

EQUIPO Y HERRAMIENTA
 %MO1 HERRAMIENTA MENOR % 0.030000

BÁSICOS
 CONC 150.1 CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" M3 0.134400


I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **DOUSARQ ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 5. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

Incumplimiento. – El documento PT-5 relación de maquinaria no cumple debido a que no se considera el llenado de la tabla en algunas maquinarias, características particulares de capacidad algunas maquinarias y no se considera número de serie solicitado en los anexos, de igual manera se tiene incongruencia en la maquina pinta.termo de 18 hp debido a que en potencia se tiene 75 hp lo cual es incongruente, por lo que es incorrecto.

 <p>MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA</p>		 <p>PROCEDIMIENTO No. DOPI-MUN-RM-PAV-LP-083-2025</p>		 <p>DOUSARQ CONSTRUCCION</p>	
<p>Modernización a la Red de Vía Urbana Santa Ana Tepetitán, frente 04, pavimentación de la Av. Dr. Mateo del Regil, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y otras complementarias, colonias Villas Perisur, Santa Ana Tepetitán, Municipio de Zapopan, Jalisco.</p>		<p>ARQ. FRANCISCO CARLOS FÉLIX GERENTE SECRETARIO</p>		<p>DOUSARQ ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V.</p>	
				<p>DOCUMENTO PT-5</p>	
				<p>FECHA: 08 DE JULIO DE 2025</p>	

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN												
PINTA TERMO	PINTA TERMO PINTA TERMO DE 18	TRAMTEX	S-4001	2012			GASOLINA	75 HP	JALISCO	X		01/08/2025
EGGENE	PLATAFORMA ARTICULADA GENE 230/20N ALTURA DE TRABAJO 11.14 M, CAP. 227 KG	GENE	Z30/20N	2015	11.4 M	227 KG	GASOLINA		JALISCO		X	01/08/2025
EQCONTADORA	CORTADORA DE PISOS WALKER NEUSON BPS 1345 ABZ	WACKER	BPS 1345 ABZ	2017			GASOLINA		JALISCO	X		01/08/2025
EQEST	ESTACION TOTAL LEICA FLEXLINE PLUS F506 R500	LEICA	FLEXLINE PLUS F5	2014			ELECTRICO		JALISCO	X		01/08/2025
EQDIN CDK	EQUIPO DE CORTE OR ACETELANO	INFRAVALVE	CDK 4520	2010			ACETELANO		JALISCO	X		01/08/2025
EQMARTH055	MARTILLO HIDRAULICO H055 DE 700 A 1200 GOLPES POR MINUTO	CATERPILLAR	H130ES	2012					JALISCO	X		01/08/2025
EQREZDC	REFRESCADOR CAT. 425 C, 80 HP 7051 KG	CATERPILLAR	426C	2012	7051 KG		DIESEL	80 HP	JALISCO		X	01/08/2025
EQGRUA	CAMION PARA GRUA DE 350 HP ARREGLADA HAB 090/AV DE 8.4 TON Y 7.20 M DE ALGANCE.	MERCEDES BENZ	090/AV	2013	8.4 TON		DIESEL	350 HP	JALISCO		X	01/08/2025
EQGRUAHAB 8.5 TON	GRUA HIDRAULICA ARTICULADA HAB 090/AV DE 8.4 TON Y ALGANCE DE 7.20 M	HAB	090/AV	2013	7.20 M		8.4 TON		JALISCO		X	01/08/2025

NOTA IMPORTANTE: TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN RENTADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARA GANADOR.

CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEPTO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN LOS CUALES SE DEBERÁ ASENTAR EL NOMBRE Y MODELO DE ESTAS.

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-112 se incumple debido a que el volumen de tapón macho galvanizado de 1/2" es incorrecto se solicitan 2 piezas de tapones macho en el concepto y se analiza solo 1 pieza, por lo que no cumple.

Página 112 de 229

DOUSARQ ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V.		
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		
Concurso No. DOPI-MUN-RM-PAV-LP-083-2025	Obra: Modernización a la Red de Vía Urbana Santa Ana Tepetitlán, frente 04, pavimentación de la Av. Dr. Mateo del Regil, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Villas Perisur, Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Duración: 122 días naturales Fecha: 08/07/2025
Lugar: Zapopan, Jalisco		Inicio Obra: 01/08/2025 Fin Obra: 30/11/2025 DOCUMENTO PT-17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: DOPI-112		2 Análisis No.: PZA 18.0000	
<p>ANÁLISIS: CUADRO DE MEDICIÓN PARA AGUA POTABLE EN TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: HERRAMIENTA, CODO DE BRONCE CON ENTRADA A POLIETILENO Y SALIDA A FIERRO GALVANIZADO CON SISTEMA A PRESIÓN DE 1/2", NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.50 M PROMEDIO), LLAVE DE PASO DE 1/2", TEE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2" (0.05 M PROMEDIO), TEE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2", TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 1/2", VALVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 1/2", CODO DE 90° GALVANIZADO DE 1/2", VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2", NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.40 M PROMEDIO), CONEXIONES, CORTES, NIVELACIÓN, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.</p>			
MATERIALES			
1-124.1	CODO DE BRONCE CON ENTRADA A POLIETILENO Y SALIDA A FIERRO GALVANIZADO CON SISTEMA A PRESIÓN DE 1/2"	PZA	1.000000
1-124.3	LLAVE DE PASO DE 1/2"	PZA	1.000000
1-124.4	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.50 M PROMEDIO)	PZA	1.000000
1-124.5	TEE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2"	PZA	2.000000
1-124.6	VALVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 1/2"	PZA	1.000000
1-124.7	CODO DE 90° GALVANIZADO DE 1/2"	PZA	1.000000
M-MEN	MATERIALES MENORES	LOTE	0.300000
1-124.8	VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	PZA	1.000000
3-013.3	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.40 M PROMEDIO)	PZA	1.000000
3-013.2	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.50 M PROMEDIO)	PZA	0.000000
100052	TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 1/2"	PZA	1.000000
MANO DE OBRA			
MO04	CUADRILLA NO. 04 (OF. TUBERO + 1 AYUDANTE)	JOR	0.290108
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN
 DOPI-MUN-RM-PAV-LP-083-2025

Modernización a la Red de Vía Urbana Santa Ana Tepetitlán, frente 04, pavimentación de la Av. Dr. Mateo del Regil, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Villas

Perisur, Santa Ana Tepetitlan, Municipio de Zapopan, Jalisco.

08 DE JULIO DEL 2025

INICIO 01 DE AGOSTO DEL 2025

TERMINO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

122 DIAS NATURALES

PT17	
Descripción	

Clave: DOPI-015

CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO. Unidad : M3
Cantidad : 635.58

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Equipo				
H	900012	CAMION DE VOLTEO DINA DE 170 HP CAPACIDAD DE 7 M3 MOTOR DE 8 CIL. CONSUMO DE DIESEL, INCLUYE: OPERADOR Y AYUDANTE.	HR	0.03764
H	905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.01978

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - c). – DOPI-032 CIMBRA ACABADO COMÚN EN DALAS Y CASTILLOS A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El rendimiento de su básico no cumple con el mínimo requerido ya que la unidad del precio unitario es por M2.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-083-2025

Modernización a la Red de Vía Urbana Santa Ana Tepetitlán, frente 04, pavimentación de la Av. Dr. Mateo del Regil, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Villas

Perisur, Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco.

08 DE JULIO DEL 2025

INICIO 01 DE AGOSTO DEL 2025

TERMINO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

122 DIAS NATURALES

PT17	
Descripción	

Clave: DOPI-032

CIMBRA ACABADO COMÚN EN DALAS Y CASTILLOS A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Unidad : M2
Cantidad : 22.12

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	Mano de Obra MO-6004	OFICIAL CARPINTERO OBRA NEGRA.	JOR	0.18140
	Herramienta 0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000

Auxiliares				
+	110050	HABILITADO DE CIMBRA COMÚN EN CIMENTACIÓN CON DUELA Y MADERA DE 2A., INCLUYE CURADO CON DIESEL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	0.95229

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-026, en el análisis se considera un básico con volumen incorrecto para la elaboración del trabajo.

Página

RA INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V.		
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-083-2025	Duración: 122 días naturales
Obra:	Modernización a la Red de Vía Urbana Santa Ana Tepetitlán, frente 04, pavimentación de la Av. Dr. Mateo del Regil, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Villas Perisur, Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 08/07/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Inicio Obra: 01/08/2025 Fin Obra: 30/11/2025 Documento: PT-17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: 1 Análisis No.:				1
Análisis:	DOPI-026	PZA		4.0000
CAJA CIEGA PARA TUBERÍA DE 10" DE 55X55X40 CM MEDIDAS INTERIORES PARA UNIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO, ASBESTO Y/O P.V.C. SANITARIO. INCLUYE: HERRAMIENTA, PISO DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA 3/8" @15 CM EN SU LECHO INFERIOR AMBOS SENTIDOS, MEDIA CAÑA FORJADA A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 12 CM, MUROS DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE LADRILLO 11X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO ACABADO PULIDO AL INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 DE 3 CM DE ESPESOR CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZÓN DE 0.20 KG/M2, LOSA TAPA SUPERIOR DE 12 CM DE ESPESOR ELABORADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA 3/8" @10 CM EN SU LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, PREPARACIÓN DE MORTEROS Y CONCRETOS, NIVELACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
BASICOS				
BA PISOCAJIE	PISO DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA 3/8" @15 CM EN SU LECHO INFERIOR AMBOS SENTIDOS	M2	*	0.688900
BA APLANADO P	APLANADO ACABADO PULIDO AL INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 DE 3 CM DE ESPESOR CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZÓN DE 0.20 KG/M2	M2	*	0.880000
BA LOSA CIEGA	LOSA TAPA SUPERIOR DE 12 CM DE ESPESOR ELABORADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA 3/8" @10 CM EN SU LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS	M2	*	0.688900
BA MECAÑA CIE	MEDIA CAÑA FORJADA A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 12 CM PARA DE CAJA CIEGA PARA TUBERÍA DE 10" DE 55X55 CM MEDIDAS INTERIORES	PZA	*	1.000000
BA MURO REG	MUROS CON BLOCK 11 X 14 X 28 CM, COLOCADO A SOGA 12 CM Y/O 14 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3	M2	*	1.072000

Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOPI-112, en el análisis no se consideran la cantidad suficiente del insumo.

Página

RA INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V.			
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Duración:	122 días naturales
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-083-2025	Fecha:	08/07/2025
Obra:	Modernización a la Red de Vía Urbana Santa Ana Tepetitlán, frente 04, pavimentación de la Av. Dr. Mateo del Regil, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Villas Perisur, Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	01/08/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Fin Obra:	30/11/2025
		Documento	PT-17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		2 Análisis No.:		1
Análisis:	DOPI-112	PZA		18.0000
<p>CUADRO DE MEDICIÓN PARA AGUA POTABLE EN TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: HERRAMIENTA, CODO DE BRONCE CON ENTRADA A POLIETILENO Y SALIDA A FIERRO GALVANIZADO CON SISTEMA A PRESIÓN DE 1/2", NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.50 M PROMEDIO), LLAVE DE PASO DE 1/2", NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.05 M PROMEDIO), TEE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2", TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 1/2", TEE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2", TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 1/2", NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.05 M PROMEDIO), CODO DE 90° GALVANIZADO DE 1/2", VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2", NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.40 M PROMEDIO), CONEXIONES, CORTES, NIVELACIÓN, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.</p>				
MATERIALES				
MA VALV COM R VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 1/2"		PZA	*	1.000000
MA NIPLE1 1/2" (NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.50 M PROMEDIO)		PZA	*	1.000000
MA NIPLE2 1/2" (NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.05 M PROMEDIO)		PZA	*	2.000000
MA CODO 1/2" G CODO 90° 1/2" GALVANIZADO		PZA	*	1.000000
MA TEE 1/2" GAL TEE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2"		PZA	*	2.000000
MA CODO BRON CODO DE BRONCE CON ENTRADA A POLIETILENO Y SALIDA A FIERRO GALVANIZADO CON SISTEMA A PRESIÓN DE 1/2"		PZA	*	1.000000
MA LLAVE DE P LLAVE DE PASO DE 1/2"		PZA	*	1.000000
MA VALV 1/2" VALVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 1/2"		PZA	*	1.000000
MA TAPON MA 1. TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 1/2"		PZA	*	1.000000
MA NIPLE3 1/2" (NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.40 M PROMEDIO)		PZA	*	1.000000
MANO DE OBRA				
MO055	OFICIAL TUBERO	JOR	/	3.000000
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	/	3.000000
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%M01	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Urbanizaciones Y Transportes Diez, S.A. De C.V.**, no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOPI-037, el análisis no considera el material necesario para la realización de los trabajos.

URBANIZACIONES Y TRANSPORTES DIEZ, S.A. DE C.V.		
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		
Concurso No. DOPI-MUN-RM-PAV-LP-083-2025 Obra: Modernización a la Red de Vía Urbana Santa Ana Tepetitlán, frente 04, pavimentación de la Av. Dr. Mateo del Regil, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Villas Perisur, Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Duración: 122 días naturales Fecha: 08/07/2025 Inicio Obra: 01/08/2025 Fin Obra: 30/11/2025	DOCUMENTO PT-17
Lugar: , Zapopan, Jalisco		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida:	2 Análisis No.:		
Análisis:	DOPI-037	M2	36.7600
APLANADO DE 3 CM DE ESPESOR EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZÓN DE 0.20 KG/M2, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			
MATERIALES			
FESTEGRAL	FESTEGRAL	KG	0.200000
MANO DE OBRA			
MOD5	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	0.100000
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
BASICOS MORT 1:3	MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4	M3	0.031500

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que “no cumplen” con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que el **presupuesto total** asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, teniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
2	ADOLFO RODRIGUEZ SERVIN	\$7,906,214.00
6	CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$6,432,739.65
7	COMERCIALIZADORA POLÍGONO, S.A. DE C.V.	\$6,675,237.03
8	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	\$6,870,440.18
11	CONSTRUCTORA BASMER, S.A. DE C.V.	\$6,494,975.99
13	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	\$7,219,515.84
22	GROUP BETA CIMENTACIONES, S.A. DE C.V.	\$6,534,698.42
24	GRUPO CONSTRUCTOR CORTELL, S.A. DE C.V.	\$6,846,794.40
26	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	\$6,626,424.94
32	LIRCON CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.	\$5,879,396.67
33	MANCOR CORPORATIVO DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$6,015,431.67
34	MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIÓN C & F, S.A. DE C.V.	\$6,808,794.10
41	SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V.	\$7,055,694.88
42	SISTEMAS ECOLÓGICOS INTELIGENTES CAREY, S.A. DE C.V.	\$6,415,527.11

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación;
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL				
		COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1	LIRCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	MANCOR CORPORATIVO DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	-\$ 328,970.25	-\$ 15,306.28	-\$ 238,357.19	-\$ 42,535.02	-\$ 1,699.86
3	SISTEMAS ECOLÓGICOS INTELIGENTES CAREY, S.A. DE C.V.	-\$ 175,318.68	\$ -	-\$ -	-\$ 7,429.16	-\$ 5,154.35
4	CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ 420,080.15	-\$ 89,017.57	\$ -	\$ -	\$ -
5	CONSTRUCTORA BASMER, S.A. DE C.V.	-\$ 198,938.53	\$ -	-\$ -	-\$ 63,892.85	\$ -
6	GROUP BETA CIMENTACIONES, S.A. DE C.V.	-\$ 65,695.04	-\$ 136,222.89	\$ -	-\$ -	\$ -
7	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 353,862.04	-\$ 52,549.06	\$ -
8	COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 633,387.22	-\$ 48,041.02	\$ -
9	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN C & F, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ -	-\$ 63,106.78	\$ -
10	GRUPO CONSTRUCTOR CORTELL, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 115,732.56	\$ -	-\$ 1,074.07
11	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 155,732.46	\$ -	-\$ -	-\$ 6,827.55
12	SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 132,410.15	\$ -	-\$ -	\$ -
13	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ -	-\$ -	-\$ 9,543.04
14	ADOLFO RODRIGUEZ SERVIN	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL			UTILIDAD (SUSTRACCIONES)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO			DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO					
1	LIRCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 5,873,396.67	DESCALIFICADO	
2	MANCOR CORPORATIVO DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	-\$ 328,970.25	-\$ 15,306.28	-\$ 238,357.19	-\$ 42,535.02	-\$ 1,699.86	-\$ 626,868.61	-\$ 546,868.46	-\$ 80,000.14	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 6,015,431.67	DESCALIFICADO	
3	SISTEMAS ECOLÓGICOS INTELIGENTES CAREY, S.A. DE C.V.	-\$ 175,318.68	\$ -	\$ -	-\$ 7,429.16	-\$ 5,154.35	-\$ 187,902.19	-\$ 475,214.08	-\$ 287,311.89	SOLVENTE	SOLVENTE	\$ 6,415,527.13	QUALIFICADO	
4	CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ 420,080.15	-\$ 89,017.57	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 509,097.72	-\$ 584,587.77	-\$ 75,490.04	SOLVENTE	SOLVENTE	\$ 6,132,739.69	QUALIFICADO	
5	CONSTRUCTORA BASMER, S.A. DE C.V.	-\$ 198,938.53	\$ -	-\$ -	-\$ 63,892.85	\$ -	-\$ 262,831.38	-\$ 590,444.47	-\$ 327,613.09	SOLVENTE	SOLVENTE	\$ 6,494,975.99	SOLVENTE	
6	GROUP BETA CIMENTACIONES, S.A. DE C.V.	-\$ 65,695.04	-\$ 136,222.89	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 201,917.93	-\$ 593,959.86	-\$ 392,041.93	SOLVENTE	SOLVENTE	\$ 6,534,696.42	SOLVENTE	
7	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 353,862.04	-\$ 52,549.06	\$ -	-\$ 406,411.10	-\$ 892,316.73	-\$ 285,925.63	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 6,625,424.91	SOLVENTE	
8	COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 633,387.22	-\$ 48,041.02	\$ -	-\$ 681,428.24	-\$ 562,391.04	-\$ 119,037.20	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 6,675,237.03	DESCALIFICADO	
9	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN C & F, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ -	-\$ 63,106.78	\$ -	-\$ 63,106.78	-\$ 618,974.72	-\$ 555,867.94	SOLVENTE	SOLVENTE	\$ 6,808,794.10	SOLVENTE	
10	GRUPO CONSTRUCTOR CORTELL, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 115,732.56	\$ -	-\$ 1,074.07	-\$ 116,806.64	-\$ 565,391.65	-\$ 448,525.01	SOLVENTE	SOLVENTE	\$ 6,846,794.40	SOLVENTE	
11	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 155,732.46	\$ -	-\$ 6,827.55	\$ -	-\$ 162,560.02	-\$ 508,994.94	-\$ 346,374.52	SOLVENTE	SOLVENTE	\$ 6,870,440.18	SOLVENTE	
12	SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 132,410.15	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 132,410.15	-\$ 522,644.07	-\$ 390,233.92	SOLVENTE	SOLVENTE	\$ 7,055,694.88	SOLVENTE	
13	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ -	-\$ -	-\$ 9,543.04	-\$ 9,543.04	-\$ 656,308.21	-\$ 646,765.17	SOLVENTE	SOLVENTE	\$ 7,219,515.84	SOLVENTE	
14	ADOLFO RODRIGUEZ SERVIN	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 7,806,214.07	DESCALIFICADO	

V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

FALLO

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si el adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato en la fecha señalada o a más tardar en el plazo que la citada Ley estipula**, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nuevo procedimiento.

De igual manera se establece que, **si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato**, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio**; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, **el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

Actuando a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco, emite el presente documento **Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e Infraestructura**.

La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **22 de julio de 2025**, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo **48** del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO




OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



ENRIQUE BARAJAS NOVOA
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN



SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

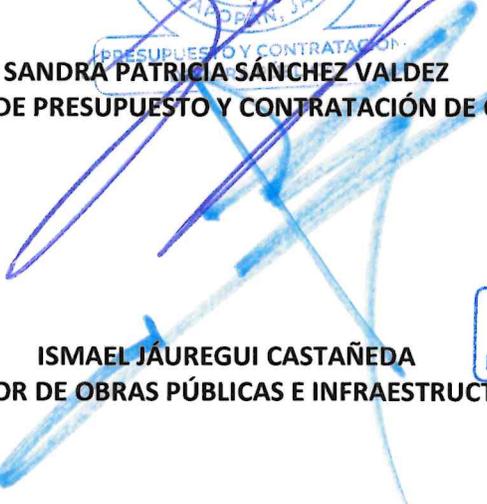

ISMAEL JÁUREGUI CASTAÑEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
