



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



En cumplimiento del artículo 48 del **Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco**, se emite el presente **Fallo** correspondiente al procedimiento de **Licitación Pública** con número: **DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023**, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: **Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.**

Habiéndose llevado a cabo el respectivo acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la **Octava Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2023**, el día **19 de abril de 2023**, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de **33 (treinta y tres)** licitantes; y llevándose a cabo posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar "si cumple" o "no cumple" los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-005. El análisis no considera equipo necesario para la realización de los trabajos de corte con disco como lo requiere el concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI- 007. El análisis no considera equipo necesario para la realización de los trabajos de corte de acero como lo requiere el concepto.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-014. El análisis no considera pago de regalías al banco de tiro como lo requiere el concepto.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



D). - La tarjeta del concepto DOPI-033 El análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como lo requiere el concepto.

A)

C VILLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.

CONSULTORÍA TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN, TOPOGRAFÍA,
 PROYECTOS Y DISEÑOS, PERITAJES, SUPERVISIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DE OBRA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
 Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.
 19 DE ABRIL DEL 2023
 FECHA DE INICIO 15 DE MAYO DEL 2023
 FECHA DE TERMINO 31 DE AGOSTO DEL 2023
 109 DIAS NATURALES

PT17

Descripción

Clave: DOPI-005

~~DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.~~

Unidad : M3
 Cantidad : 102.96

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra MO-1000	PEON.	JOR	0.02526
Herramienta 0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000
Equipo H 905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.49836
H 905065	MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 580 S.K.	HR	0.49836



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



B)

C VILLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.

CONSULTORÍA TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN, TOPOGRAFÍA,
 PROYECTOS Y DISEÑOS, PERITAJES, SUPERVISIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DE OBRA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023

Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección. UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.

19 DE ABRIL DEL 2023

FECHA DE INICIO 15 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE TERMINO 31 DE AGOSTO DEL 2023

109 DIAS NATURALES

PT17

Descripción

Clave: DOPI-007

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE DE ACERO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, VOLUMEN MEDIDO E SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Unidad : M3
 Cantidad : 2.12

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra				
	MO-1000	PEON.	JOR	0.02526
Herramienta				
	0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000
Equipo				
	H 905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.49836
	H 905064	MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 580 S.K.	HR	0.49836



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



C)

C VILLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.

CONSULTORÍA TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN, TOPOGRAFÍA,
 PROYECTOS Y DISEÑOS, PERITAJES, SUPERVISIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DE OBRA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023

Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.

19 DE ABRIL DEL 2023

FECHA DE INICIO 15 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE TERMINO 31 DE AGOSTO DEL 2023

109 DIAS NATURALES

PT17

Descripción

Clave: DOPI-014

CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

Unidad : M3
 Cantidad : 2,189.45

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
---	-------	-------------	--------	----------

Equipo

H	905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.01795
H	900012	CAMION DE VOLTEO DINA DE 170 HP CAPACIDAD DE 7 M3 MOTOR DE 8 CIL. CONSUMO DE DIESEL, INCLUYE: OPERADOR Y AYUDANTE.	HR	0.03329



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

D)

C VILLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.

CONSULTORÍA TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN, TOPOGRAFÍA,
 PROYECTOS Y DISEÑOS, PERITAJES, SUPERVISIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DE OBRA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
 Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.
 19 DE ABRIL DEL 2023
 FECHA DE INICIO 15 DE MAYO DEL 2023
 FECHA DE TERMINO 31 DE AGOSTO DEL 2023
 109 DIAS NATURALES

PT17	
Descripción	

Clave: DOPI-033
 PAVIMENTO DE 22 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-48, R.R. A 14 DÍAS, T.M.A. 38 MM COLOR ROJO TERRACOTA INTEGRADO AL 4% ACABADO TEXTURIZADO CON PEINE DE 1" DE SEPARACIÓN APROXIMADA, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, VOLTEADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
MR4514	CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-48, R.N., T.M.A. 38 MM A 14 DÍAS	m3	0.22000
63035	MEMBRANA PLASTICA ZIP-CAP DE 5 CMS. DE ANCHO.	ML	0.27500
01580	CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS Y GUARNICIONES.	M2	0.36000
Mano de Obra			
80515	OFICIAL ALBAÑIL Y PEON	JOR	0.09033
Herramienta			
0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000
Equipo			
H 922124	VIBRADOR PARA CONCRETO DE 4 HP MCA. JOPER MOD. K-4 INC. OPERADOR	HR	0.01083
Alquileres 30610	CURADO DE CONCRETO CON CURACRETO ROJO	M2	0.49078



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO






Fundamento. – El punto IV de las bases de licitación relativo a IV.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN Y LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. *Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.*



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. - a). – DOPI-005, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

~~a). El concepto pide corte con disco para delimitar el área de demolición y no se toma en cuenta la maquinaria para la realización adecuada de dicha actividad.~~



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A. DE C.V.	
Dependencia:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Licitación No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
Obra:	Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Duración:	109 días naturales
Fecha:	19/04/2023
Inicio Obra:	15/05/2023
Fin Obra:	31/08/2023
DOCUMENTO	
PT 17	
Lugar:	, Zapopan, Jalisco

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A11		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI-005		M3		102.9600

DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA				
MO02	CUADRILLA NO. 02 (1 AYUDANTE)	jor	*	0.031250

EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
EQRE426C	RETROEXCAVADORA CAT. 426 C, 80 HP, 7051 KG, CUCHARON GRAL. 0.96 M3, CUCHARON RETRO 0.18 M3, 4.70 M. DE PROF.	HORA	*	0.250000
EQMARTH130ES	MARTILLO HIDRÁULICO H130ES DE 320-600 GOLPES POR MINUTO PARA EXCAVADORA CAT	HORA	*	0.250000



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Incumplimiento. - b). – DOPI-006 DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide corte con disco para delimitar el área de demolición y no se toma en cuenta la maquinaria para la realización adecuada de dicha actividad.

DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A. DE C.V.	
Dependencia:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Licitacion No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
Obra:	Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Duración:	109 días naturales
Fecha:	19/04/2023
Inicio Obra:	15/05/2023
Fin Obra:	31/08/2023
DOCUMENTO PT 17	
Lugar:	, Zapopan, Jalisco

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A11		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI-006		M3		281.0100

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA
 MO02 CUADRILLA NO. 02 (1 AYUDANTE) jor * 0.031250

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
EQRE426C	RETROEXCAVADORA CAT. 426 C. 80 HP, 7051 KG, CUCHARON GRAL 0.98 M3, CUCHARON RETRO 0.18 M3, 4.70 M. DE PROF.	HORA	*	0.250000
EQMARTH130ES	MARTILLO HIDRÁULICO H130ES DE 320-600 GOLPES POR MINUTO PARA EXCAVADORA CAT	HORA	*	0.250000



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Incumplimiento. - c). – DOPI-011 DESMONTAJE Y RETIRO POR MEDIOS MECÁNICOS SIN RECUPERACIÓN DE HERRERÍA PARA BOCA DE TORMENTA (REJILLA DE VIGA 2", 3" Y 4", REJILLA TIPO IRVING) EMPOTRADA A DALAS Y/O LOSA DE CONCRETO, ANCHO PROMEDIO DE REJILLA DE 0.30 M A 1.50 M POR LARGO VARIABLE, INCLUYE: HERRAMIENTA, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, DESMONTAJE DE MARCO Y CONTRAMARCO, MATERIALES, DESPERDICIOS, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y RESTRICTIVA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL SITIO FUERA DE LA OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN.

a.- El concepto pide retiro del material fuera de la obra y no se toma en cuenta ningún vehículo para su traslado.

DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A. DE C.V.	
Dependencia:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Licitacion No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
Obra:	Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Duración:	109 días naturales
Fecha:	19/04/2023
Inicio Obra:	15/05/2023
Fin Obra:	31/08/2023
DOCUMENTO	
PT 17	
Lugar:	Zapopan, Jalisco

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A11		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI-011		M2		29.5000
DESMONTAJE Y RETIRO POR MEDIOS MECÁNICOS SIN RECUPERACIÓN DE HERRERÍA PARA BOCA DE TORMENTA (REJILLA DE VIGA 2", 3" Y 4", REJILLA TIPO IRVING) EMPOTRADA A DALAS Y/O LOSA DE CONCRETO, ANCHO PROMEDIO DE REJILLA DE 0.30 M A 1.50 M POR LARGO VARIABLE, INCLUYE: HERRAMIENTA, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, DESMONTAJE DE MARCO Y CONTRAMARCO, MATERIALES, DESPERDICIOS, SENALIZACION PREVENTIVA Y RESTRICTIVA DEL AREA DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL AREA AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL SITIO FUERA DE LA OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN.				

MANO DE OBRA

1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	jor	*	0.166667
1S1E	CUADRILLA No 17 (1 SOLDADOR+1 AY.ESP.)	jor	*	0.050000

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
EQ.OXI-COR	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HORA	*	0.125000
EQRE-26C	RETROEXCAVADORA CAT. 426 C. 80 HP, 7051 KG, CUCHARON GRAL. 0.98 M3, CUCHARON RETRO 0.16 M3, 4.70 M. DE PROF.	HORA	*	0.125000
EQMARTH30ES	MARTILLO HIDRÁULICO H130ES DE 320-600 GOLFES POR MINUTO PARA EXCAVADORA CAT	HORA	*	0.125000



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

Incumplimiento. - d). – DOPI-076 al DOPI-081 GUARNICIÓN TIPO "L" EN SECCIÓN 35-20X45 Y CORONA DE 15 CM DE ALTURA POR 12X15 CM, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2., T.M.A. 19 MM., R.N., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

a.- El concepto pide concreto de f'c=250 kg/cm2 R.N. cambiando la especificación del concreto ya que se analiza con f'c=250 kg/cm2 R.R. a 14 dias.

DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A. DE C.V.	
Dependencia:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Licitacion No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
Obra:	Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Duración:	109 días naturales
Fecha:	19/04/2023
Inicio Obra:	15/05/2023
Fin Obra:	31/08/2023
DOCUMENTO	
PT 17	
Lugar:	Zapopan, Jalisco

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.


Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	
Partida:	A4	Análisis No.:		1	
Análisis:	DOPI-076	M		534.6500	
GUARNICIÓN TIPO "L" EN SECCION 35-20X45 Y CORONA DE 15 CM DE ALTURA POR 12X15 CM, DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2., T.M.A. 19 MM., R.N., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
MATERIALES					
307-CON-0101	CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2., T.M.A. 3/4", A 14 DIAS	M3	*	0.115750	
10188	CURACRETO BLANCO	LT	*	0.230000	
MANO DE OBRA					
MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	jor	*	0.055000	
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQVIB STOW	VIBRADOR STOW AW 1880 DE 8 HP	HORA	*	0.036000	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000	
BASICOS	CIMBRA MET	CIMBRA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	*	1.000000



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

B. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-006, el análisis no considera el corte con disco solicitado en la descripción del concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-038, el análisis no considera el material solicitado en la descripción del concepto.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-113, el análisis no considera el material solicitado en la descripción del concepto.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-126, el análisis considera trabajos no solicitados en la descripción del concepto.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO





Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR S.A. DE C.V.		
Dependencia:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Licitación No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023	Duración: 109 días naturales
Obra:	"Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco."	Fecha: 19/04/2023 Inicio Obra: 15/05/2023 Fin Obra: 31/08/2023
Lugar:	Colonias: Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, ZAPOPAN, Jalisco	

DOCUMENTO
 PT 17

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A11		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI-006		m3		281.0100
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
AMAPE-129	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operación, capacidad de cucharón 1.25 yd3	hora	/	3.500000
AMAPE-361	Martillo hidráulico H95Es de 700-1.260 golpes por minuto para retroexcavadoras cargadoras Cat o con excavadoras pequeñas	hora	/	3.500000
BASICOS				
ACAR-001	Acarreo de material producto de excavación y/o demolición a banco de obra para su posterior retiro, volumen medido compacto. Incluye: mano de obra y equipo.	m3	*	1.500000





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR S.A. DE C.V.

Dependencia: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Licitación No.: DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023

Obra: "Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco."

Lugar: Colonias: Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, ZAPOPAN, Jalisco

Duración: 109 días naturales

Fecha: 19/04/2023

Inicio Obra: 15/05/2023

Fin Obra: 31/08/2023

DOCUMENTO
PT 17

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A13		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI-038		kg		4,592.5900
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 75 CM DE DESARROLLO A CADA 60 CM DE SEPARACIÓN, (FY= 2800 KG/CM2) INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, CORTES, COLOCACIÓN, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

MATERIALES


ACCH-003B	Varilla corrugada acero de refuerzo del # 4 (1/2") fyp = 4200 kg/cm2	kg	*	1.050000
-----------	--	----	---	----------

MANO DE OBRA

MOCU-004	Cuadrilla No 4 (1 Fierro + 1 Ayudante general)	jor	*	0.007343
----------	--	-----	---	----------

EQUIPO Y HERRAMIENTA

FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	*	0.030000
---------	-------------------	-------	---	----------

OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR S.A. DE C.V.		
Dependencia:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Licitacion No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023	Duración: 109 días naturales
Obra:	"Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco."	Fecha: 19/04/2023
		Inicio Obra: 15/05/2023
		Fin Obra: 31/08/2023
		DOCUMENTO PT 17
Lugar:	Colonias: Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, ZAPOPAN, Jalisco	

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
--------	----------	--------	-----	----------

Partida: A61 Análisis No.: 1

Análisis: DOPI-113 m2 36.8500

REDUCTOR DE VELOCIDAD A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-45 KG/CM2, FRAGUADO RÁPIDO 3 DÍAS, T.M.A. 3/4", DE 4.50 M DE ANCHO CON 0.20 M DE ESPESOR. MAS CORONA TRAPEZOIDAL DE 10 CM DE ALTURA CON 1.50 M DE ANCHO Y LARGO VARIABLE DEPENDIENDO DEL ANCHO DE VIALIDAD, TERMINADO PULIDO, DISEÑO SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MATERIALES

PREM-051	Concreto premezclado MR-45, R.R., tma=38 mm a 3 días	m3	*	0.262500
PASA-175	Membrana de curado de concreto Cubeta de 19 lts	PZA	*	0.010526
AACE-0191B	Canal monten calibre 12	kg	*	0.100000
SOLU-049	Desmoldante liquido para cimbras listo para usarse cubeta 19 lts	PZA	*	0.000629

MANO DE OBRA

MOCU-046	Cuadrilla No 46 (1 Albañil + 5 Ayudantes)	jor	*	0.030000
----------	---	-----	---	----------

EQUIPO Y HERRAMIENTA

AMALI-017	Vibrador de gasolina marca Felsa modelo vibromax cap. 12000 VPM, con manguera de 4.00 mts. y cabezal de por 38 mm (1 1/2"), con motor de gasolina de 4 H. P.	hora	*	0.075000
FAHEME	Herramienta menor	(%)mo	*	0.030000





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. *Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.*





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUTAG, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

C. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO


1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-005. El análisis no considera equipo necesario para la realización de los trabajos de corte con disco como lo requiere el concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI- 007. El análisis no considera equipo necesario para la realización de los trabajos de corte de acero como lo requiere el concepto.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-057. El análisis no considera resistencia de concreto como la requiere el concepto de trabajo.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-094. El análisis no considera resistencia de concreto como la requiere el concepto de trabajo.





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

A)

construTAG, S.A. de C.V.
 constructora

LICITACION PUBLICA NO.
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023

INICIO: 15/MAYO/2023
 TERMINO: 31/AGOSTO/2023
 PLAZO: 109 DIAS NATURALES
 ENTREGA: 19/ABRIL/2023

CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL
 Y OBRA INTEGRAL EN AV. SANTA
 CECILIA, ETAPA 01, INCLUYE
 CONEXION CON CALLE SANTA
 LAURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,
 COLONIAS SANTA MARGARITA
 1A SECCION, UAG, REAL DEL
 PARQUE, MUNICIPIO DE
 ZAPOPAN, JALISCO.

PT17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Descripción		Unidad	Cantidad
Clave: DOPJ-005 DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.		M3	102.96

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
Equipo	H	EXCA RETRO C/MART	RETROEXCAVADORA CAT 426 CON MARTILLO HIDRAULICO	HORA	0.40000



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



B)

construTAG, S.A. de C.V.
 constructora

LICITACION PUBLICA NO.
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023

INICIO: 15/MAYO/2023
 TERMINO: 31/AGOSTO/2023
 PLAZO: 109 DIAS NATURALES
 ENTREGA: 19/ABRIL/2023

CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL
 Y OBRA INTEGRAL EN AV. SANTA
 CECILIA, ETAPA 01, INCLUYE
 CONEXION CON CALLE SANTA
 LAURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,
 COLONIAS SANTA MARGARITA
 1A SECCION, UAG, REAL DEL
 PARQUE, MUNICIPIO DE
 ZAPOPAN, JALISCO.

PT17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Descripción

Clave: DOPI-007

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO,
 INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE DE ACERO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU
 POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, VOLUMEN MEDIDO E SECCIONES,
 ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Unidad : M3
 Cantidad : 2.12

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
		Equipo H (EXCA RETRO C/MART	HORA	0.50000
		RETROEXCAVADORA CAT 426 CON MARTILLO HIDRAULICO		



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



C)

construTAG, S.A. de C.V.
 constructora

LICITACION PUBLICA NO.
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023

INICIO: 15/MAYO/2023
 TERMINO: 31/AGOSTO/2023
 PLAZO: 109 DIAS NATURALES
 ENTREGA: 19/ABRIL/2023

CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL
 Y OBRA INTEGRAL EN AV. SANTA
 CECILIA, ETAPA 01, INCLUYE
 CONEXION CON CALLE SANTA
 LAURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,
 COLONIAS SANTA MARGARITA
 1A SECCION, UAG, REAL DEL
 PARQUE, MUNICIPIO DE
 ZAPOPAN, JALISCO.

PT17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Descripción

Clave: DOPI-057
 GUARNICIÓN TIPO "I" EN SECCIÓN 15 X 30 CM DE ALTURA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 200 Unidad : M
 KG/CM2., T.M.A. 19 MM., R.N., ACABADO COMÚN EN COSTADOS Y PULIDO EN CORONA, INCLUYE. Cantidad : 670.58
 HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
A:CON PRE 250 N 3/4	CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c 250 KG/CM2 NORMAL DE 3/4"	M3	0.05600
A:ADIT CUR ROJ	CURACRETO ROJO	LTO	0.10000
Auxiliares			
+ CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (ALBAÑIL + PEON)	JOR	0.04050
+ CIMA APA MUR TRA COL	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTE	M2	0.26500

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

D)

construTAG, S.A. de C.V.
 constructora

LICITACION PUBLICA NO.
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023

INICIO: 15/MAYO/2023
 TERMINO: 31/AGOSTO/2023
 PLAZO: 109 DIAS NATURALES
 ENTREGA: 19/ABRIL/2023

CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL
 Y OBRA INTEGRAL EN AV. SANTA
 CECILIA, ETAPA 01, INCLUYE
 CONEXION CON CALLE SANTA
 LAURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,
 COLONIAS SANTA MARGARITA
 1A SECCION, UAG, REAL DEL
 PARQUE, MUNICIPIO DE
 ZAPOPAN, JALISCO.

PT17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Descripción

Clave: DOPI-094

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO DE 6" DE DIÁMETRO, COLOR GRIS MARTILLO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, FABRICADO EN TUBO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 30, DE 1.10 M DE LONGITUD (0.75 M VISIBLE Y 0.35 M OCULTO), TAPA SUPERIOR DE PLACA 3/16" C/ESCUDO EN ACERO INOXIDABLE (RECORTE LASER), 3 CALCOMANÍAS COLOR BLANCO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE DE 3 CM DE ANCHO, 4 ANILLOS DE HERRERÍA PARA PROTEGER PLACA Y CALCOMANÍAS REFLEJANTES (VER DETALLE EN PROYECTO), CON ANCLAS SOLDADAS DE VARILLA DE 1/2" DE 10 CM PARA SU ANCLAJE, INCLUYE: DADO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 40X40X40 CM, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Unidad : PZA
 Cantidad : 74.00

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
BOL-6"	BOLARDO DE 6" DE DIÁMETRO, FABRICADO EN TUBO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 30, DE 1.15 M DE DESARROLLO	PZA	1.00000
VAR-3-8	VARILLA CORRUGADA DEL NO. 3 AL NO. 8	KG	0.52500
Auxiliares			
+ CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (ALBAÑIL + PEON)	JOR	0.18500
+ B.CONC F'c=200, HO	CONCRETO F'c=200kg/cm2, HECHO EN OBRA	MS	0.06780



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad



Fundamento. – El punto IV de las bases de licitación relativo a IV.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN Y LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO



1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-006. El análisis no considera equipo necesario para la realización de los trabajos de corte con disco como lo requiere el concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI- 007. El análisis no considera equipo necesario para la realización de los trabajos de corte de acero como lo requiere el concepto.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-014. El análisis no considera pago por regalías al banco de tiro como lo requiere el concepto.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-041. El análisis no considera material ni equipo necesario para la realización de los trabajos como lo requiere el concepto.

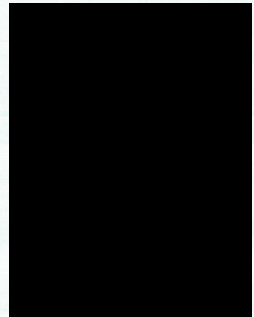



**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO**



A)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CONVOCATORIA NO.: 005/2023	DOCUMENTO	PT17	
	A LA LICITACION NO.: DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023			
	 Obras Públicas e Infraestructura Gestión Integral de la Ciudad	FECHA DE CONCURSO:	19/abr./2023	
		FECHA DE INICIO:	15/05/2023	
		FECHA DE TERMINO:	31/08/2023	
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	HOJA: DE:	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y OBRA INTEGRAL EN AV. SANTA CECILIA, ETAPA 01, INCLUYE CONEXIÓN CON CALLE SANTA LAURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIAS SANTA MARGARITA 1A SECCIÓN, UAG, REAL DEL PARQUE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA S.A. DE C.V.	ING. JORGE ALFREDO CONTRERAS ROBLES	6 de 304	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

DOPI-006 DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DEFINIR ÁREA, CARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. M3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
MQ980601	Equipo MARTILLO HIDRAULICO P/RETROEXCAVADORA	hr	0.500000
MQ980655	RETROEXCAVADORA CAT-416D	hr	0.500000

[Handwritten signature in blue ink]



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO





B)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CONVOCATORIA NO.: 005/2023	DOCUMENTO	PT17
	A LA LICITACION NO.: DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023	FECHA DE CONCURSO:	19/abr./2023
		FECHA DE INICIO:	15/05/2023
		FECHA DE TERMINO:	31/08/2023
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	PLAZO DE EJECUCION	109 DÍAS NATURALES
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y OBRA INTEGRAL EN AV. SANTA CECILIA, ETAPA 01, INCLUYE CONEXIÓN CON CALLE SANTA LAURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIAS SANTA MARGARITA 1A SECCIÓN, UAG, REAL DEL PARQUE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA S.A. DE C.V.	FIRMA DEL LICITANTE:	HOJA: DE:
		ING. JORGE ALFREDO CONTRERAS ROBLES	7 de 304

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

DOPI-007 DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE DE ACERO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, VOLUMEN MEDIDO E SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. M3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	Equipo		
MC980054	MARTILLO HIDRAULICO P/RETROEXCAVADORA	hr	0.700000
MC980255	RETROEXCAVADORA CAT-416D	hr	0.700000





**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO**





C)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CONVOCATORIA NO.: 005/2023	DOCUMENTO	PT17
	A LA LICITACIÓN NO.: DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023		
		FECHA DE CONCURSO:	19/abr./2023
		FECHA DE INICIO:	15/05/2023
		FECHA DE TERMINO:	31/08/2023
	PLAZO DE EJECUCION	109 DÍAS NATURALES	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	HOJA: DE:
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y OBRA INTEGRAL EN AV. SANTA CECILIA, ETAPA 01, INCLUYE CONEXIÓN CON CALLE SANTA LAURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIAS SANTA MARGARITA 1A SECCIÓN, UAG, REAL DEL PARQUE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA S.A. DE C.V.	ING. JORGE ALFREDO CONTRERAS ROBLES	14 de 304

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

DOPI-014	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.		M3
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	Equipo		
MQ980170	CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3	hr	0.018000
MQ980255	RETROEXCAVADORA CAT-416D	hr	0.018500

[Handwritten signatures in blue ink]





**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO**




D)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CONVOCATORIA NO.: 005/2023	DOCUMENTO	PT17
	A LA LICITACION NO.: DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023		
		FECHA DE CONCURSO:	19/abr./2023
		FECHA DE INICIO:	15/05/2023
FECHA DE TERMINO:		31/08/2023	
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	PLAZO DE EJECUCION	109 DÍAS NATURALES
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y OBRA INTEGRAL EN AV. SANTA CECILIA, ETAPA 01, INCLUYE CONEXIÓN CON CALLE SANTA LAURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIAS SANTA MARGARITA 1A SECCIÓN, UAG, REAL DEL PARQUE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA S.A. DE C.V.	FIRMA DEL LICITANTE:	HOJA: DE:
		ING. JORGE ALFREDO CONTRERAS ROBLES	41 de 304

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

DOPI-041 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA ELABORACIÓN DE CRUCE DE CICLOVÍA DOS SENTIDOS, EN CUADROS DE 40X40 CM Y/O 50X50 CM, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2 SOBRE PAVIMENTO APLICADA CON MAQUINA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. M2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	Materiales		
MA200316	SEÑALAMIENTO "CRUCE DE CICLOVIAS 2 SENTIDOS"	m2	1.000000
	Mano de Obra		
MO950299	AYUDANTE	jor	0.060000
MO950326	OFICIAL ESPECIALIZADO	jor	0.060000
	Herramienta		
HERR	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000

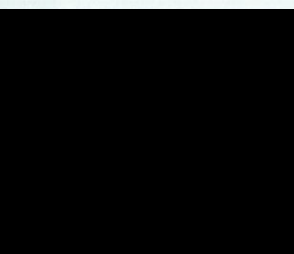



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO




Fundamento. – El punto IV de las bases de licitación relativo a IV.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN Y LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. *Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.*



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

B. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). – Nomenclatura de conceptos no corresponde con documento PE1 catálogo de conceptos.


B). - La tarjeta del concepto ZAP23.5. El análisis no considera equipo requerido para la realización de los trabajos de corte con disco como lo requiere el concepto.

C). - La tarjeta del concepto ZAP23.5.1. El análisis no considera equipo requerido para la realización de los trabajos de corte de acero como lo requiere el concepto.

~~D). - La tarjeta del concepto ZAP23.6. El análisis no considera pago de regalías al banco de tiro como lo requiere el concepto.~~

A)

GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
Concurso No.:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
Obra:	Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco
Duración:	109 días naturales
Fecha:	19/04/2023
Inicio Obra:	15/05/2023
Fin Obra:	31/08/2023
Lugar:	Zapopan, Jalisco



GR
GRUPO CONSTRUCTOR
DE LA REGIÓN

DOCUMENTO
PT 17

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A1				1
Analisis: ZAP23.1.1		M3		13.1400
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO LIBRE A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
MANO DE OBRA				
M003	PEON	JOR	*	0.020000
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MOHERR	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
EQ-040	RETROEXCAVADORA CAT 416	HR	*	0.108214
(CD) Costo directo				
(CI) INDIRECTOS 8.0006%				
SUBTOTAL1				
(CF) FINANCIAMIENTO 0.8416%				
SUBTOTAL2				
(CU) UTILIDAD 8.0000%				
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)				
(* OCHENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N. *)				

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNID
A	PAVIMENTACIÓN	
A1	PRELIMINARES	
DOPI-001	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO LIBRE A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M
DOPI-002	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CARPETA ASFÁLTICA SOBRE BASE DE EMPEDRADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO LIBRE A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M
DOPI-003	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO Y/O LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO LIBRE A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M
DOPI-004	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO DE ADQUÍN DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M
DOPI-005	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A	M




MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

B)

GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
Obra:	Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco
Lugar:	Zapopan, Jalisco
 GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION	
Duración: 109 días naturales	
Fecha: 19/04/2023	
Inicio Obra: 15/05/2023	
Fin Obra: 31/08/2023	
DOCUMENTO PT 17	

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A1		Unidad		1
Análisis: ZAP23.5		M3		281.0100

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS. INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.


MANO DE OBRA				
MO03	PEON	JOR	*	0.044918

EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MOHERR	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
EQ-040	RETROEXCAVADORA CAT 416	HR	*	0.048000
EQ-RETR C/MAR	RETROEXCAVADORA C/CARG FRONTAL 3/4 YD3 CASE SERIE M TURBO EQUIPADA CON MARTILLO HIDRAULICO	HR	*	0.206426

(CD) Costo directo		
(CI) INDIRECTOS	8.0006%	
SUBTOTAL1		
(CF) FINANCIAMIENTO	0.8416%	
SUBTOTAL2		
(CU) UTILIDAD	8.0000%	
(CV) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		

C)

Página 7 de 308

GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
Obra:	Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco
Lugar:	, Zapopan, Jalisco
 GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN	
Duración: 109 días naturales Fecha: 19/04/2023 Inicio Obra: 15/05/2023 Fin Obra: 31/08/2023 DOCUMENTO PT 17	

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A1		Análisis No.:		1
Análisis: ZAP23.5.1	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE DE ACERO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, VOLUMEN MEDIDO E SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3		2.1200
MANO DE OBRA				
MO03	PEON	JOR	*	0.124332
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ-RETR C/MAR	RETROEXCAVADORA C/CARG FRONTAL 3/4 YD3 CASE SERIE M TURBO EQUIPADA CON MARTILLO HIDRAULICO	HR	*	0.955812
%MOHERR	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000

(CD) Costo directo
 (CI) INDIRECTOS
 SUBTOTAL1
 (CF) FINANCIAMIENTO
 SUBTOTAL2
 (CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
 (* OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. *)

8.0006%
 0.8416%
 8.0000%



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

D)

Página 14 de 308

GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V.		GR GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023	Duración: 109 días naturales
Obra:	Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco	Fecha: 19/04/2023
Lugar:	, Zapopan, Jalisco	Inicio Obra: 15/05/2023
		Fin Obra: 31/08/2023
		DOCUMENTO PT 17

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A1		Análisis No.:		1
Análisis: ZAP23.6		M3		2,189.4500
CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.				
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ-040	RETROEXCAVADORA CAT 416	HR	*	0.023795
EQ-082	CAMION DE VOLTEO DE 14 M3	HR	*	0.010293

(CD) Costo directo
 (CI) INDIRECTO 8.0006%
 SUBTOTAL1
 (CF) FINANCIAMIENTO 0.8416%
 SUBTOTAL2
 (CU) UTILIDAD 8.0000%
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
 * VEINTISEIS PESOS 37/100 M.N. *)

Handwritten signature

Handwritten signature



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO





Fundamento. – El punto IV de las bases de licitación relativo a IV.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN Y LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

C. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO



1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-006. El análisis no considera equipo necesario para la realización de los trabajos de corte con disco como lo requiere el concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI- 037. El análisis no considera equipo necesario para la realización de los trabajos de corte con disco como lo requiere el concepto.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-092. El análisis no considera proporción de mortero como la requiere concepto de trabajo.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-094. El análisis no considera resistencia de concreto como la requiere concepto de trabajo.





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

SOKAKLAR

CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.



Construcciones, Electrificaciones y
 Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.

A) **SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. EN ASOCIACION CON CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.**

MUNICIPIO DE ZAPOPAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y OBRA INTEGRAL EN AV. SANTA CECILIA, ETAPA 01, INCLUYE CONEXIÓN CON CALLE SANTA LAURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIAS SANTA MARGARITA 1A SECCIÓN, UAG, REAL DEL PARQUE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

FECHA DE PRESENTACION: 19 DE ABRIL DE 2023.

LICITACION: DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023.

FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO DE 2023.

FECHA DE TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2023.

PLAZO DE EJECUCION: 109 DÍAS NATURALES.

PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Descripción

Clave: DOPI-005

DEMOLICIÓN DE CUBIERTA DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA. ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.



Unidad : M3
 Cantidad : 102.96

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra AYUDANTE	Ayudante General	Jor	0.01456
Herramienta HERR	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
Equipo MEQ-0010	RETROEXCAVADORA CASE 580 SL	HORA	0.27533

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

B)

SOKAKLAR

CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.



Construcciones, Electrificaciones y
 Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.

SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. EN ASOCIACION CON CONSTRUCCIONES,
 ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y OBRA INTEGRAL EN AV. SANTA CECILIA, ETAPA 01, INCLUYE CONEXIÓN CON CALLE SANTA LAURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIAS SANTA MARGARITA 1A SECCIÓN, UAG. REAL DEL PARQUE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

FECHA DE PRESENTACION: 19 DE ABRIL DE 2023.

LICITACION: DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023.

FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO DE 2023.

FECHA DE TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2023.



PLAZO DE EJECUCION: 109 DÍAS NATURALES.

PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Descripción
 Clave: DOPI-037
 CALAFATEO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 13 MM X 17 MM, CON BACKER-ROD DE 13 MM DE DIÁMETRO (CINTILLA DE POLIURETANO) Y SELLA POR FURTO JUNTAS SUPERSEAL P TIPO FESTER O SIMILAR. INCLUYE: HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE LA JUNTA, ENSANCHE CON CORTADORA HASTA 13 MM, MATERIAL, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Unidad: M
 Cantidad: 6,842.48

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
SIKAFLE 1-A	Sikaflex 1-A	Kg	0.02759
BAKER-ROD	Cintilla de Poliuretano (Baker-Rod)	m	1.05000
Mano de Obra			
AYUDANTE	Ayudante General	jor	0.01000
OF-ALBAÑIL	Oficial Albañil	jor	0.01000
Herramienta			
HERR	Herramienta menor	(% imc)	0.05000





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



C)

SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.



Construcciones, Electrificaciones y
 Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.

**SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. EN ASOCIACION CON CONSTRUCCIONES,
 ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.**

MUNICIPIO DE ZAPOPAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y OBRA INTEGRAL EN AV. SANTA CECILIA, ETAPA 01. INCLUYE CONEXIÓN CON CALLE SANTA LAURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIAS SANTA MARGARITA 1A SECCIÓN, UAG, REAL DEL PARQUE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

FECHA DE PRESENTACION: 19 DE ABRIL DE 2023.

LICITACION: DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023.

FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO DE 2023.

FECHA DE TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2023.

PLAZO DE EJECUCION: 109 DIAS NATURALES.

PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Descripción

Clave: DOPI-092

APLANADO DE 2 CM DE ESPESOR EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO FINO; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



Unidad : M2
 Cantidad : 135.70

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra			
OF-ALBAÑIL	Oficial Albañil	jor	0.04167
PEON	Peon de obra	jor	0.04167
Herramienta			
HERR	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
Auxiliares			
BAS-021	Mortero de cemento-arena, prop. 1:3	m3	0.02100
BAS-027	Suministro y acarreo de agua	m3	0.02000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



D)

SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.



Construcciones, Electrificaciones y
 Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.

**SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. EN ASOCIACION CON CONSTRUCCIONES,
 ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.**

MUNICIPIO DE ZAPOPAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y OBRA INTEGRAL EN AV. SANTA CECILIA, ETAPA 01, INCLUYE CONEXIÓN CON CALLE SANTA LAURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIAS SANTA MARGARITA 1A SECCIÓN, UAG, REAL DEL PARQUE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

FECHA DE PRESENTACION: 19 DE ABRIL DE 2023.
 LICITACION: DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023.
 FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO DE 2023.
 FECHA DE TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2023.
 PLAZO DE EJECUCION: 109 DIAS NATURALES.

PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Descripción

Clave: DOPI-094

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO DE 6" DE DIÁMETRO, COLOR GRIS MARTILLO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, FABRICADO EN TUBO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 30, DE 1.10 M DE LONGITUD (0.75 M VISIBLE Y 0.35 M OCULTO), TAPA SUPERIOR DE PLACA 3/16" O/ESCUDO EN ACERO INOXIDABLE (RECORTE LASER), 3 CALCOMANÍAS COLOR BLANCO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE DE 3 CM DE ANCHO, 4 ANILLOS DE HERRERÍA PARA PROTEGER PLACA Y CALCOMANÍAS REFLEJANTES (VER DETALLE EN PROYECTO), CON ANCLAS SOLDADAS DE VARILLA DE 1/2" DE 10 CM PARA SU ANCLAJE. INCLUYE: DADO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 40X40X40 CM, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Unidad : PZA
 Cantidad : 74.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
ACA-KM-SUB	Tarifa de Acarreos de material para kilometros subsecuentes	m3-km	1.30000
BOLARDO ZAP	Bolardo metalico construido con tubo de acero de 6", de 1.15 m de altura tapa superior de placa 3/16" o/escudo en acero inoxidable, cinta reflejante grado ingeniería color blanco, terminado en pintura poliéster homeada.	pza	1.00000
Mano de Obra			
OF-ALBANIL	Oficial Albañil	jor	0.06667
AYUDANTE	Ayudante General	jor	0.06667
Herramienta			
HERR	Herramienta menor	(%lmo	0.03000
Equipo			
MEQ-0033	VIBRADOR STOW AW 1680 DE 8 H.P., FLECHA FLEXIBLE 20 FT	hora	0.02177
Auxiliares			
BAS-008	CONCRETO F'C=200KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 20MM., FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREOS A 1RA. ESTACION A 20.00M.	M3	0.06730
BAS-012	Curado de concreto con membrana	m2	0.16000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO





Fundamento. – El punto IV de las bases de licitación relativo a IV.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN Y LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

D. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO



1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI- 007. El análisis no considera equipo necesario para la realización de los trabajos de corte de acero como lo requiere el concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI- 046. El análisis no considera equipo necesario para la realización de los trabajos de corte de acero como lo requiere el concepto.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-060. El análisis no considera resistencia de concreto como lo requiere concepto de trabajo.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-119. El análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos.

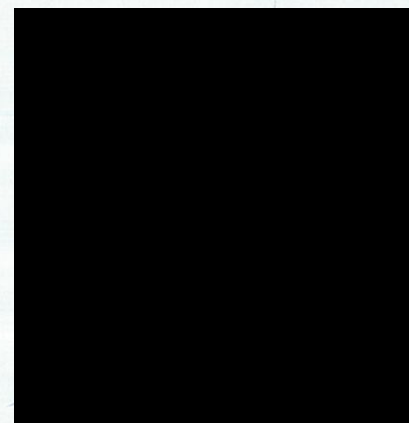



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

A)

Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
Obra:	Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	Zapopan, Jalisco
Duración:	109 días naturales
Fecha:	19/04/2023
Inicio Obra:	15/05/2023
Fin Obra:	31/08/2023
	PT-17



TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A1		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI-007		M3		2.1200
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE DE ACERO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

MANO DE OBRA



MO02 CUADRILLA NO. 02 (1 AYUDANTE) JOR * 0.014711

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % * 0.030000

EQRE426C RETROEXCAVADORA CAT. 426 C, 80 HP, 7051 KG, CUCHARON GRAL. 0.96 M3, CUCHARON RETRO 0.16 M3, 4.70 M. DE PROF. HOR * 0.350000

~~EQMARTH95ES MARTILLO HIDRAULICO H95ES DE 700 A 1260 GOLPES POR MINUTO HOR * 0.350000~~





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

B **Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.**

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA


Concurso No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023

Obra: Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Lugar: , Zapopan, Jalisco

Duración: 109 días naturales
 Fecha: 19/04/2023

Inicio Obra: 15/05/2023
 Fin Obra: 31/08/2023
 PT-17



TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: C1				1
Análisis: DOPI-046		M3		3.7900
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE DE ACERO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, VOLUMEN MEDIDO E SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

MANO DE OBRA



MO02 CUADRILLA NO. 02 (1 AYUDANTE) JOR * 0.014711

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % * 0.030000

EQRE426C RETROEXCAVADORA CAT. 426 C, 80 HP, 7051 KG, CUCHARON HOR * 0.350000
 GRAL. 0.96 M3, CUCHARON RETRO 0.16 M3, 4.70 M. DE PROF.

EQMARTH95ES MARTILLO HIDRAULICO H95ES DE 700 A 1260 GOLPES POR HOR * 0.350000
 MINUTO





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

C)

Página 6

Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
Obra:	Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco
Lugar:	Zapopan, Jalisco
Duración:	109 días naturales
Fecha:	19/04/2023
Inicio Obra:	15/05/2023
Fin Obra:	31/08/2023
	PT-17



TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: C3				Análisis No.: 1
Análisis: DOPI-060		M2		228.7700
FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C= 100 KG/CM2, CABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
MATERIALES				
100304	CONCRETO PREMEZCLADO, TIRO DIRECTO F' C=200 KG/CM2, T.M.A=3/4, R.N.	M3	*	0.084000
10186	CURACRETO BLANCO	LT	*	0.200000
MANO DE OBRA				
MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	*	0.050000
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
BASICOS				
CIMBRA.MET	CIMBRA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	*	1.000000





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

D)

Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No.:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023	
Obra:	Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Duración: 109 días naturales
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Fecha: 19/04/2023
		Inicio Obra: 15/05/2023
		Fin Obra: 31/09/2023
		PT-17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: F2		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI-119		PZA		7.0000
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (RESTRICTIVO, INFORMATIVO O PREVENTIVO), CON DOS TABLEROS DE 0.61X0.61 M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON PELÍCULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, ADICIONAL UN TABLERO DE 0.61 X 0.20 M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON PELÍCULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, INCLUYE HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2"X2" Y CON ALTURA LIBRE DE MÍNIMO 2.50 M DESDE NIVEL DE SUELO A PARTE INFERIOR DEL TABLERO DE LA SEÑAL EN CALIBRE 12, DADO DE CONCRETO DE F'c= 150 KGICM ² HECHO EN OBRA DE 40X40X80 CM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				



MATERIALES

1-214.1	SEÑALAMIENTO VERTICAL (RESTRICTIVO, INFORMATIVO O PREVENTIVO), CON DOS TABLEROS DE 0.61X0.61 M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON VINIL REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, INCLUYE: POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2"X2" Y CON ALTURA LIBRE DE MÍNIMO 2.50 M DESDE NIVEL DE SUELO A PARTE INFERIOR DEL TABLERO DE LA SEÑAL EN CALIBRE 14	PZA	*	1.000000
---------	--	-----	---	----------

MANO DE OBRA

MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBANIL - AYUDANTE)	JOR	*	0.245188
------	---	-----	---	----------

EQUIPO Y HERRAMIENTA





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO





Fundamento. – El punto IV de las bases de licitación relativo a IV.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN Y LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **AR+IN, S.A. DE C.V** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

E. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO



1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-005. El análisis no considera equipo necesario para la realización de los trabajos de corte con disco como lo requiere el concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI- 007. El análisis no considera equipo necesario para la realización de los trabajos de corte de acero como lo requiere el concepto.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-014. El análisis no considera pago de regalías al banco de tiro como lo requiere el concepto.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-033 El análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como lo requiere el concepto.






MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

A)



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023

Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.

19 DE ABRIL DEL 2023

FECHA DE INICIO 15 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE TERMINO 31 DE AGOSTO DEL 2023

109 DIAS NATURALES

PT17


Descripción

Clave: DOPI-005

~~DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ALCARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.~~

Unidad : M3
 Cantidad : 102.96

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	Mano de Obra			
	MO-1000	PEON.	JOR	0.03063
	Herramienta			
	0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000
	Equipo			
	H 905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION, INC. OPERACION	HR	0.60442
	H 905065	MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 580 S.K.	HR	0.60442





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



B)



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023

Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.

19 DE ABRIL DEL 2023

FECHA DE INICIO 15 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE TERMINO 31 DE AGOSTO DEL 2023

109 DIAS NATURALES

PT17



Descripción

Clave: DOPI-007

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE DE ACERO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, VOLUMEN MEDIDO E SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Unidad : M3
 Cantidad : 2.12

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra MO-1000	PEON.	JOR	0.03063
Herramienta 0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000
Equipo H 905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.60442
H 905065	MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 560 S.K.	HR	0.60442






MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



c)



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023

Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.

19 DE ABRIL DEL 2023

FECHA DE INICIO 15 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE TERMINO 31 DE AGOSTO DEL 2023

109 DIAS NATURALES

PT17
Descripción

Clave: DOPI-014

CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

Unidad : M3
 Cantidad : 2,189.45

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Equipo				
H	905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.02176
H	900012	CAMION DE VOLTEO DINA DE 170 HP CAPACIDAD DE 7 M3. MOTOR DE 8 CIL. CONSUMO DE DIESEL, INCLUYE: OPERADOR Y AYUDANTE.	HR	0.04037

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



D)



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023

Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.

19 DE ABRIL DEL 2023

FECHA DE INICIO 15 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE TERMINO 31 DE AGOSTO DEL 2023

109 DÍAS NATURALES

PT17



Descripción

Clave: DOPI-033

PAVIMENTO DE 22 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-48, R.R. A 14 DÍAS, T.M.A. 38 MM, COLOR ROJO TERRACOTA INTEGRADO AL 4%, ACABADO TEXTURIZADO CON PEINE DE 1" DE SEPARACIÓN APROXIMADA, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, VOLTEADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Unidad : M2
 Cantidad : 131.48

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	MR4514	CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-48, R.N., T.M.A. 38 MM A 14 DÍAS	m3	0.22000
	63035	MEMBRANA PLASTICA ZIP-CAP DE 5 CMS. DE ANCHO.	ML	0.27500
	01580	CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS Y GUARNICIONES.	M2	0.36000
Mano de Obra				
	80515	OFICIAL ALBAÑIL Y PEON	JOR	0.10954
Herramienta				
	0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000
Equipo				
	H 922124	VIBRADOR PARA CONCRETO DE 4 HP MCA. JOPER MOD. K-4 INC. OPERADOR	HR	0.01313
Auxiliares				
	+ 130610	CURADO DE CONCRETO CON CURACRETO ROJO	M2	0.59524





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO





Fundamento. – El punto IV de las bases de licitación relativo a IV.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN Y LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

F. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO


1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI- 007. El análisis no considera equipo necesario para la realización de los trabajos de corte de acero como lo requiere el concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI- 117. El análisis no considera rendimiento de concreto como lo requiere el concepto de trabajo.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-119. El análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como lo requiere el concepto de trabajo.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-217. El análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como lo requiere el concepto de trabajo.





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO





Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

A)

NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A. DE C.V		ILUDE.CO ILUMI + CONST + EL + CIVIL	
Ciente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Duración:	109 días naturales
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023	Fecha:	19/04/2023
Obra:	Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	15/05/2023
		Fin Obra:	31/08/2023
Lugar:	, ZAPOPAN, JALISCO		PT17

ANÁLISIS DE TARJETAS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:	A1	Análisis No.:		1
Análisis:	DOPI-007	M3		2.1200
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE DE ACERO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS. VOLUMEN MEDIDO E SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
MANO DE OBRA				
MO02	CUADRILLA NO. 02 (1 AYUDANTE)	JOR	*	0.014711
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
EQRE426C	RETROEXCAVADORA CAT. 426 C, 80 HP, 7051 KG, CUCHARON GRAL. 0.96 M3, CUCHARON RETRO 0.16 M3, 4.70 M. DE PROF.	HOR	*	0.456046
EQMARTH95ES	MARTILLO HIDRAULICO HISES DE 700 A 1260 GOLPES POR MINUTO	HOR	*	0.456046





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO





Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

B)

NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A. DE C.V		ILUDE.CO	
Ciente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023	Duración:	109 días naturales
Obra:	Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha:	19/04/2023
		Inicio Obra:	15/05/2023
		Fin Obra:	31/08/2023
Lugar:	, ZAPOPAN, JALISCO	PT17	

ANALISIS DE TARJETAS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:	F2	Análisis No.:		1
Análisis:	DOPI-117	PZA		13.0000
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (RESTRICTIVO, INFORMATIVO O PREVENTIVO) DE 0.61X0.61 M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON PELÍCULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD. INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2"X2" Y CON ALTURA LIBRE DE MÍNIMO 2.50 M DESDE NIVEL DE SUELO A PARTE INFERIOR DEL TABLERO DE LA SEÑAL EN CALIBRE 12, DADO DE CONCRETO DE F' C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 40X40X80 CM. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
MATERIALES				
1-064.1	SEÑALAMIENTO VERTICAL (RESTRICTIVO, INFORMATIVO O PREVENTIVO) DE 0.61X0.61 M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON VINIL REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, INCLUYE: POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2"X2" Y CON ALTURA LIBRE DE MÍNIMO 2.50 M DESDE NIVEL DE SUELO A PARTE INFERIOR DEL TABLERO DE LA SEÑAL EN CALIBRE 14	PZA	*	1.000000
MANO DE OBRA				
MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	*	0.196149
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
BASICOS				
CONC.150.1	CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4"	M3	*	0.067200





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

C)

NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A. DE C.V		ILUDE.CO	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Duración:	109 días naturales
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023	Fecha:	19/04/2023
Obra:	Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	15/05/2023
Lugar:	ZAPOPAN, JALISCO	Fin Obra:	31/08/2023
			PT17

ANÁLISIS DE TARJETAS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:	F2	Análisis No.:		1
Análisis:	DOPI-119	PZA		7.0000
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (RESTRICTIVO, INFORMATIVO O PREVENTIVO), CON DOS TABLEROS DE 0.61X0.61 M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON PELÍCULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, ADICIONAL UN TABLERO DE 0.61 X 0.20 M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON PELÍCULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2"X2" Y CON ALTURA LIBRE DE MÍNIMO 2.50 M DESDE NIVEL DE SUELO A PARTE INFERIOR DEL TABLERO DE LA SEÑAL EN CALIBRE 12, DADO DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 40X40X80 CM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				

MATERIALES

1-214.1	SEÑALAMIENTO VERTICAL (RESTRICTIVO, INFORMATIVO O PREVENTIVO), CON DOS TABLEROS DE 0.61X0.61 M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON VINIL REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, INCLUYE: POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2"X2" Y CON ALTURA LIBRE DE MÍNIMO 2.50 M DESDE NIVEL DE SUELO A PARTE INFERIOR DEL TABLERO DE LA SEÑAL EN CALIBRE 14	PZA	*	1.000000
---------	--	-----	---	----------

MANO DE OBRA


MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	*	0.245166
------	---	-----	---	----------

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
------	-------------------	---	---	----------

BASICOS

CONC.150.1	CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2 T.M.A/ 3/4"	M3	*	0.067270
------------	--	----	---	----------





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad



D)

Página 222 de 304

NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A. DE C.V		ILUDE.CO <small>INSTRUMENTACIÓN Y OBRAS DE CIVIL</small>
Ciente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023	Duración: 109 días naturales
Obra:	Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 19/04/2023
		Inicio Obra: 15/05/2023
		Fin Obra: 31/08/2023
Lugar:	, ZAPOPAN, JALISCO	PT17

ANALISIS DE TARJETAS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:	G6	Análisis No.:		1
Análisis:	DOPI-217	KG		295.1200
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDONDO LISO DE 3/8". INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, RECORTES, SOLDADURAS, PRIMARIO ANTICORROSIVO, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
MATERIALES				
PERFIL.HERRER	TUBERIA DE ACERO AL CARBON ROLADA Y SOLDADA CON COSTURA RECTA Y EMPATES CIRCUNFERENCIALES DE 20" DE DIAMETRO EXTERIOR CEDULA 40 X 1/2" DE ESPESOR	KG	*	1.050000
SOLD.7018	SOLDADURA ELECTRODO 7018	KG	*	0.050000
PINT.ANTICOR	PINTURA ANTICORROSIVA	LT	*	0.010000
M-MEN	MATERIALES MENORES	LOTE	*	0.050000
PINT.ESMALTE2	PINTURA ESMALTE CUALQUIER COLOR	LT	*	0.010000
MANO DE OBRA				
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	*	0.017000
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	*	0.017000
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
EQPULIDOR	ESMERILADORA ELECTRICA	HOR	*	0.069685
EQSOLD.SAE300	SOLDADORA LINCOLN SAE 300 AMP K1277 DE 60 HP MOTOR PERKINS 4236, 4 CIL 1600 RPM (SIN OPERADOR)	HOR	*	0.011615
EQ.OXI-COR	EQUIPO DE CORTE OXIACETILENO	HR	*	0.050000

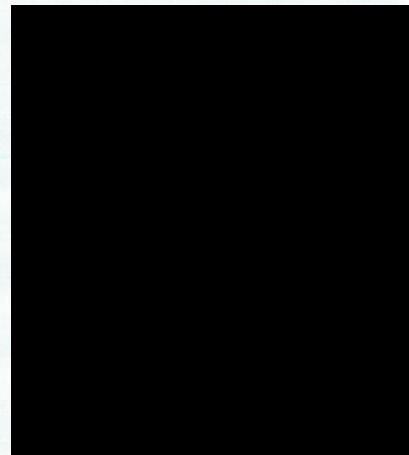



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Fundamento. – El punto IV de las bases de licitación relativo a IV.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN Y LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

G. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI- 007. El análisis no considera equipo necesario para la realización de los trabajos de corte de acero como lo requiere el concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI- 117. El análisis no considera rendimiento de concreto como lo requiere el concepto de trabajo.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-119. El análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como lo requiere el concepto de trabajo.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-217. El análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como lo requiere el concepto de trabajo.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

A)

MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO
 PT 17

Procedimiento No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023	Inicio de la obra:	15/05/2023
Licitante:	VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Terminación de la obra:	31/08/2023
Obra:	Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Plazo:	109 días
		Fecha de Presentación:	19/04/2023

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



DOPI-007	M3	2.1296
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE DE ACERO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, VOLUMEN MEDIDO E SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.		

Código	MANO DE OBRA	Unidad	Cantidad
M002	CUADRILLA NO. 02 (1 AYUDANTE)	JOR	0.014632

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

Código	EQUIPO Y HERRAMIENTA	Unidad	Cantidad
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
EQRE426C	RETROEXCAVADORA CAT. 426 C, 80 HP, 7051 KG, CUCHARON GRAL. 0.96 M3, CUCHARON RETRO 0.16 M3, 4.70 M. DE PROF.	HOR	0.453589
EQMARTH95ES	MARTILLO HIDRAULICO H95ES DE 700 A 1260 GOLPES POR MINUTO	HOR	0.453589

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA



B)

Página 117 de 304

MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO
PT 17

Procedimiento No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023	Inicio de la obra:	15/05/2023
Licitante:	VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Terminación de la obra:	31/08/2023
Obra:	Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Plazo:	109 días
		Fecha de Presentación:	19/04/2023

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DOPI-117 PZA 13.0000

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (RESTRICTIVO, INFORMATIVO O PREVENTIVO) DE 0.61X0.61 M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON PELÍCULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2"X2" Y CON ALTURA LIBRE DE MÍNIMO 2.50 M DESDE NIVEL DE SUELO A PARTE INFERIOR DEL TABLERO DE LA SEÑAL EN CALIBRE 12, DADO DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 40X40X80 CM. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Código	MATERIALES	Unidad	Cantidad
1-064.1	SEÑALAMIENTO VERTICAL (RESTRICTIVO, INFORMATIVO O PREVENTIVO) DE 0.61X0.61 M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON VINIL REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, INCLUYE: POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2"X2" Y CON ALTURA LIBRE DE MÍNIMO 2.50 M DESDE NIVEL DE SUELO A PARTE INFERIOR DEL TABLERO DE LA SEÑAL EN CALIBRE 14	PZA	1.000000

SUBTOTAL: MATERIALES

Código	MANO DE OBRA	Unidad	Cantidad
MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBANIL + 1 AYUDANTE)	JOR	0.195092


SUBTOTAL: MANO DE OBRA

Código	EQUIPO Y HERRAMIENTA	Unidad	Cantidad
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

Código	BASICOS	Unidad	Cantidad
CONC.150.1	CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4"	M3	0.067200

SUBTOTAL: BASICOS





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

C)

Página 119 de 304

MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO
 PT 17

Procedimiento No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023	Inicio de la obra:	15/05/2023
Licitante:	VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Terminación de la obra:	31/08/2023
Obra:	Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Plazo:	109 días
		Fecha de Presentación:	19/04/2023

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DOPI-119 PZA 7.0000
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (RESTRICTIVO, INFORMATIVO O PREVENTIVO) CON DOS TABLEROS DE 0.61X0.61 M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON PELÍCULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, ADICIONAL UN TABLERO DE 0.61 X 0.20 M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON PELÍCULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, INCLUYE HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2"X2" Y CON ALTURA LIBRE DE MÍNIMO 2.50 M DESDE NIVEL DE SUELO A PARTE INFERIOR DEL TABLERO DE LA SEÑAL EN CALIBRE 12, DADO DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 40X40X80 CM. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Código	MATERIALES	Unidad	Cantidad
1-214.1	SEÑALAMIENTO VERTICAL (RESTRICTIVO, INFORMATIVO O PREVENTIVO), CON DOS TABLEROS DE 0.61X0.61 M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON PELÍCULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, INCLUYE HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2"X2" Y CON ALTURA LIBRE DE MÍNIMO 2.50 M DESDE NIVEL DE SUELO A PARTE INFERIOR DEL TABLERO DE LA SEÑAL EN CALIBRE 14	PZA	1.000000

SUBTOTAL: MATERIALES

Código	MANO DE OBRA	Unidad	Cantidad
MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	0.243865

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

Código	EQUIPO Y HERRAMIENTA	Unidad	Cantidad
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

Código	BASICOS	Unidad	Cantidad
CONC.150.1	CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM T.M.A. 3/4"	M3	0.067200

SUBTOTAL: BASICOS



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



D)

MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO
 PT 17

Procedimiento No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023	Inicio de la obra:	15/05/2023
Licitante:	VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Terminación de la obra:	31/08/2023
Obra:	Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita 1a Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Plazo:	109 días
		Fecha de Presentación:	19/04/2023

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DOPI-217		KG	295.1200
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDONDO LISO DE 3/8", INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, RECORTES, SOLDADURAS, PRIMARIO ANTICORROSIVO, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			

Código	MATERIALES	Unidad	Cantidad
PERFIL HERRERIA.5	TUBERIA DE ACERO AL CARBON ROLADA Y SOLDADA CON COSTURA RECTA Y EMPATES CIRCUNFERENCIALES DE 20" DE DIAMETRO EXTERIOR CEDULA 40 X 1/2" DE ESPESOR	KG	1.050000
SOLD.7018	SOLDADURA ELECTRODO 7018	KG	0.050000
PINT.ANTICOR	PINTURA ANTICORROSIVA	LT	0.010000
M-MEN	MATERIALES MENORES	LOTE	0.050000
PINT.ESMALTE2	PINTURA ESMALTE CUALQUIER COLOR	LT	0.010000

SUBTOTAL: MATERIALES

Código	MANO DE OBRA	Unidad	Cantidad
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	0.016908
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	0.016908

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

Código	EQUIPO Y HERRAMIENTA	Unidad	Cantidad
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
EQPULIDOR	ESMERILADORA ELECTRICA	HOR	0.069310
EQSOLD.SAE300A	SOLDADORA LINCOLN SAE 300 AMP K1277 DE 60 HP MOTOR PERKINS 4236, 4 CIL 1600 RPM (SIN OPERADOR)	HOR	0.011552
EQ.OXI-COR	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HR	0.049731
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Fundamento. – El punto IV de las bases de licitación relativo a IV.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN Y LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

NO.	LICITANTES	RESULTADO
2	PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
5	NICZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
11	CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
12	VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	CUMPLE
13	CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTOS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
15	A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
16	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
19	BUCOJAL S.A. DE C.V.	CUMPLE
21	CONSTRUMOVA, S.A. P.I. DE C.V.	CUMPLE
24	RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
25	URBAMENTAL, S.A. DE C.V.	CUMPLE
26	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE BOMBEO, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
28	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	CUMPLE
29	KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
33	DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
38	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CUMPLE
39	SM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
40	DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	CUMPLE



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



42	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
43	ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
44	EDIFICACIONES Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V.	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que “no cumplen” con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, obteniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
2	PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$23,342,341.86
5	NICZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$23,129,340.60
11	CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.	\$21,815,747.06
12	VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$23,129,377.90
13	CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTOS, S.A. DE C.V.	\$29,030,319.83
15	A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$21,857,436.63
16	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$23,085,768.56
19	BUCOJAL S.A. DE C.V.	\$23,164,274.19
21	CONSTRUMOVA, S.A. P.I. DE C.V.	\$21,613,232.13
24	RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.	\$24,433,288.40
25	URBAMENTAL, S.A. DE C.V.	\$23,084,678.46
26	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE BOMBEO, S. DE R.L. DE C.V.	\$22,865,119.68
28	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	\$23,180,016.98
29	KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$23,502,214.83
33	DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$23,799,252.96
38	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$23,157,492.25
39	5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$23,269,148.41
40	DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$24,229,086.86
41	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	\$23,623,116.26
42	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	\$28,241,109.18
43	ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	\$23,307,459.42
44	EDIFICACIONES Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V.	\$24,363,360.98



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación;
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMÉTICA

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y OBRA INTEGRAL EN AV. SANTA CECILIA, ETAPA 01, INCLUYE CONEXIÓN CON CALLE SANTA LAURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIAS SANTA MARGARITA 1A SECCIÓN, UAG, REAL DEL PARQUE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTRATO
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023

Rango de aceptación	10%	Promedio total	\$ 23,278,981.57	Promedio mínimo	\$ 20,951,083.42
Techo financiero	\$ 23,789,981.57			Promedio máximo	\$ 25,606,879.73

IMPORTE DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

CÓDIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPUESTA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
			MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1	CONSTRUMOVA, S.A. P.I. DE C.V.	\$ 21,615,332.13	\$ 15,219,934.82	\$ 4,354,693.18	\$ 1,107,776.98	\$ 1,319,279.64	\$ 25,658.22	\$ 1,307,899.92	\$ -
2	CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.	\$ 21,815,747.06	\$ 12,972,099.42	\$ 3,754,312.33	\$ 3,146,337.11	\$ 2,061,984.56	\$ 41,000.03	\$ 1,334,853.91	\$ -
3	AS IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE RL. DE C.V.	\$ 21,827,436.63	\$ 11,853,166.92	\$ 4,013,914.25	\$ 3,113,947.83	\$ 1,409,337.70	\$ 55,746.33	\$ 1,712,283.45	\$ -
4	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE BOMBEO, S. DE RL. DE C.V.	\$ 22,065,119.68	\$ 15,264,306.33	\$ 3,243,377.12	\$ 869,069.38	\$ 1,378,327.47	\$ 31,349.94	\$ 2,078,703.03	\$ -
5	URBAMENTAL, S.A. DE C.V.	\$ 23,084,678.46	\$ 15,251,808.72	\$ 3,270,511.16	\$ 869,107.11	\$ 1,563,918.76	\$ 31,399.53	\$ 2,090,654.53	\$ -
6	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 23,085,768.36	\$ 12,515,006.64	\$ 3,659,693.89	\$ 3,032,223.64	\$ 1,308,962.79	\$ 65,537.10	\$ 2,171,441.58	\$ -
7	NICZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 23,129,340.60	\$ 13,144,894.77	\$ 3,362,148.40	\$ 3,207,365.65	\$ 1,176,664.93	\$ 45,740.20	\$ 1,292,071.56	\$ -
8	VIALTEK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$ 23,129,377.90	\$ 12,948,102.52	\$ 3,291,792.73	\$ 3,051,706.47	\$ 1,545,328.14	\$ 50,179.46	\$ 2,235,582.70	\$ -
9	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ 23,157,492.25	\$ 13,214,455.38	\$ 3,295,257.77	\$ 2,890,878.10	\$ 1,358,043.49	\$ 103,793.32	\$ 2,294,870.39	\$ -
10	BUCCIAL S.A. DE C.V.	\$ 23,164,274.19	\$ 13,688,982.76	\$ 3,072,363.00	\$ 2,549,694.25	\$ 1,892,481.92	\$ 49,099.75	\$ 1,912,735.93	\$ -
11	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	\$ 23,180,016.98	\$ 13,280,643.57	\$ 3,278,795.03	\$ 2,694,175.15	\$ 1,283,938.64	\$ 64,286.42	\$ 2,377,650.40	\$ -
12	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	\$ 23,241,109.18	\$ 12,994,587.60	\$ 3,719,465.34	\$ 3,353,019.28	\$ 1,336,149.42	\$ 241,200.44	\$ 1,996,983.20	\$ -
13	SM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 23,269,143.41	\$ 15,272,734.66	\$ 3,418,310.42	\$ 3,190,994.97	\$ 1,297,328.94	\$ 35,725.52	\$ 2,115,909.45	\$ -
14	ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	\$ 23,307,459.42	\$ 15,185,484.96	\$ 3,442,856.93	\$ 3,215,915.27	\$ 1,296,191.16	\$ 32,000.63	\$ 2,134,895.96	\$ -
15	PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 23,342,341.86	\$ 13,301,258.81	\$ 3,390,122.34	\$ 3,009,991.00	\$ 1,562,509.77	\$ 33,569.07	\$ 1,945,028.29	\$ -
16	KALEX CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 23,503,214.83	\$ 15,302,289.24	\$ 3,390,122.34	\$ 3,141,347.40	\$ 1,586,700.24	\$ 33,786.48	\$ 2,048,679.89	\$ -
17	CONSTRUARA, S.A. DE C.V.	\$ 23,623,116.26	\$ 14,180,431.90	\$ 2,633,308.63	\$ 3,201,972.60	\$ 1,413,718.54	\$ 46,287.23	\$ 2,147,496.89	\$ -
18	DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 23,799,252.96	\$ 14,439,303.92	\$ 4,604,513.50	\$ 827,326.17	\$ 1,872,324.03	\$ 85,820.52	\$ 1,967,191.56	\$ -
19	DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 24,229,086.86	\$ 13,729,812.38	\$ 1,891,290.00	\$ 2,728,477.88	\$ 1,710,977.76	\$ 83,369.89	\$ 1,826,123.71	\$ -
20	EDIFICACIONES Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V.	\$ 24,365,380.98	\$ 15,002,058.00	\$ 3,780,032.71	\$ 3,628,889.88	\$ 1,553,963.32	\$ 37,212.67	\$ 2,212,284.16	\$ -
21	RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.	\$ 24,433,288.40	\$ 15,326,793.52	\$ 2,425,677.25	\$ 1,973,477.27	\$ 1,548,350.76	\$ 118,107.36	\$ 2,120,982.11	\$ -
22	CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTOS, S.A. DE C.V.	\$ 29,030,319.03	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

	IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMIBLES	HONORARIOS Y MANO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
Sustraendo \$	23,278,981.57	\$ 13,468,955.92	\$ 3,526,622.06	\$ 2,634,661.93	\$ 1,466,295.07	\$ 63,582.79	\$ 2,070,091.97	\$ -

III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL				
		COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1	CONSTRUMOVA, S.A. P.I. DE C.V.	-\$ 249,021.10	\$ -	-\$ 1,446,085.55	-\$ 147,015.43	-\$ 39,924.57
2	CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.	-\$ 891,056.50	\$ -	\$ -	-\$ 404,730.50	-\$ 22,502.76
3	AS IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V.	-\$ 1,915,789.00	\$ -	\$ -	-\$ 56,557.37	-\$ 9,835.96
4	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE BOMBEO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ -	-\$ 203,044.94	-\$ 1,765,592.55	-\$ 87,767.60	-\$ 32,232.05
5	URBAMENTAL, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 256,100.90	-\$ 1,765,554.02	\$ -	-\$ 32,193.26
6	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ 953,949.28	\$ -	\$ -	-\$ 157,332.28	\$ -
7	NICZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ 324,061.15	-\$ 164,473.66	\$ -	-\$ 289,430.54	-\$ 17,841.99
8	VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	-\$ 520,853.40	-\$ 234,829.33	\$ -	\$ -	-\$ 5,403.34
9	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	-\$ 254,500.54	-\$ 231,334.29	\$ -	-\$ 106,251.56	\$ -
10	BUCOJAL S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 454,259.06	-\$ 84,967.68	\$ -	-\$ 14,483.04
11	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	-\$ 188,310.35	-\$ 247,827.03	\$ -	-\$ 182,356.43	\$ -
12	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	-\$ 874,368.32	\$ -	\$ -	-\$ 130,145.65	\$ -
13	5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ 196,221.26	-\$ 108,311.64	\$ -	-\$ 228,966.13	-\$ 27,857.27
14	ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	-\$ 283,470.96	-\$ 83,765.13	\$ -	-\$ 170,103.91	-\$ 31,502.16
15	PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	-\$ 167,697.11	-\$ 136,499.72	\$ -	\$ -	-\$ 30,013.73
16	KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	-\$ 166,672.68	-\$ 136,499.72	\$ -	-\$ -	-\$ 29,796.31
17	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 893,313.45	\$ -	-\$ 53,316.53	-\$ 17,295.56
18	DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 1,607,335.76	\$ -	\$ -
19	DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 1,635,372.06	\$ -	\$ -	\$ -
20	EDIFICACIONES Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V.	-\$ 466,897.92	\$ -	\$ -	-\$ -	-\$ 26,370.13
21	RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 1,261,184.66	\$ -	\$ -
22	CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Obras Públicas e
Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO					VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL PARCIAL	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL							
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO													
1	CONSTRUMOVA, S.A. P.I. DE C.V.	-	249,021.10	-	1,446,825.55	-	147,015.43	-	39,924.57	-	1,822,846.66	-	1,907,899.92	-	374,046.75	DESCALIFICADO	\$ 21,613,232.13	DESCALIFICADO	
2	CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.	-	891,256.50	-	-	-	404,730.50	-	22,502.76	-	1,319,089.77	-	1,324,653.61	-	84,236.16	DESCALIFICADO	\$ 21,815,747.06	DESCALIFICADO	
3	A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V.	-	1,915,729.00	-	-	-	56,357.37	-	9,835.98	-	1,921,122.35	-	1,712,293.63	-	209,080.70	DESCALIFICADO	\$ 21,857,436.63	DESCALIFICADO	
4	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE BOMBEO, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	283,044.94	-	1,715,592.55	-	87,767.60	-	32,232.83	-	2,160,637.94	-	89,854.91	DESCALIFICADO	\$ 22,865,119.68	DESCALIFICADO	
5	URBAMENTAL, S.A. DE C.V.	-	-	-	256,100.90	-	1,715,554.82	-	-	-	32,199.28	-	2,053,844.98	-	44,605.55	SOLVENTE	\$ 23,084,678.46	GANADOR	
6	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	953,949.26	-	-	-	157,332.28	-	-	-	1,111,281.56	-	2,473,441.69	-	1,362,180.12	SOLVENTE	\$ 23,085,768.56	SOLVENTE	
7	NACZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	324,061.15	-	164,273.66	-	-	299,430.34	-	17,641.99	-	795,607.54	-	1,921,071.56	-	1,494,264.22	SOLVENTE	\$ 23,129,340.60	SOLVENTE
8	VALUTEX GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	-	520,533.40	-	234,229.33	-	-	-	5,409.34	-	761,069.07	-	2,235,562.70	-	1,474,476.63	SOLVENTE	\$ 23,157,492.25	SOLVENTE	
9	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	-	254,500.54	-	211,316.29	-	-	106,231.54	-	-	594,059.41	-	1,294,670.39	-	1,700,753.98	SOLVENTE	\$ 23,164,274.19	SOLVENTE	
10	BUOJAL S.A. DE C.V.	-	-	-	454,239.06	-	14,967.63	-	-	-	553,709.78	-	1,912,735.93	-	1,359,026.17	SOLVENTE	\$ 23,180,016.98	SOLVENTE	
11	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	-	285,330.35	-	247,817.03	-	-	182,356.43	-	-	816,493.81	-	2,377,650.40	-	1,759,156.60	SOLVENTE	\$ 23,241,109.10	SOLVENTE	
12	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	-	674,386.32	-	-	-	180,145.85	-	-	-	1,004,513.97	-	1,994,829.20	-	992,469.22	SOLVENTE	\$ 23,269,148.41	SOLVENTE	
13	SM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	196,221.26	-	106,311.64	-	-	228,966.13	-	27,857.27	-	561,356.30	-	2,115,509.45	-	1,554,153.16	SOLVENTE	\$ 23,307,459.42	SOLVENTE
14	ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	-	283,470.96	-	83,765.13	-	-	170,103.91	-	31,502.16	-	568,642.18	-	1,134,895.96	-	1,564,055.80	SOLVENTE	\$ 23,342,341.86	SOLVENTE
15	PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	-	167,697.11	-	136,499.72	-	-	-	-	30,013.73	-	334,210.56	-	1,945,029.29	-	1,610,617.74	SOLVENTE	\$ 23,502,214.81	SOLVENTE
16	KALEZA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	-	166,872.64	-	136,499.72	-	-	-	29,796.31	-	332,961.71	-	2,048,879.89	-	1,715,911.18	SOLVENTE	\$ 23,623,116.26	SOLVENTE	
17	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	-	-	-	893,313.45	-	-	53,316.53	-	17,295.56	-	963,923.54	-	2,147,496.89	-	1,183,571.35	SOLVENTE	\$ 23,799,252.96	SOLVENTE
18	DORMANT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	1,807,335.76	-	-	-	1,607,335.76	-	1,985,131.56	-	157,795.60	SOLVENTE	\$ 24,229,088.89	SOLVENTE	
19	DINAMIO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	-	1,635,372.06	-	-	-	-	-	1,635,372.06	-	1,302,129.71	-	372,751.68	SOLVENTE	\$ 24,363,160.93	SOLVENTE	
20	EDIFICACIONES Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V.	-	466,697.92	-	-	-	-	-	26,376.13	-	493,266.05	-	2,152,214.69	-	1,845,046.53	SOLVENTE	\$ 24,431,128.40	SOLVENTE	
21	RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.	-	-	-	1,241,154.66	-	-	-	-	-	1,241,154.66	-	1,726,842.11	-	899,297.43	SOLVENTE	\$ 29,030,319.83	DESCALIFICADO	
22	CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 29,030,319.83	DESCALIFICADO		

V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO					VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL PARCIAL	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL							
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO													
1	CONSTRUMOVA, S.A. P.I. DE C.V.	-	249,021.10	-	1,446,825.55	-	147,015.43	-	39,924.57	-	1,822,846.66	-	1,907,899.92	-	374,046.75	DESCALIFICADO	\$ 21,613,232.13	DESCALIFICADO	
2	CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.	-	891,256.50	-	-	-	404,730.50	-	22,502.76	-	1,319,089.77	-	1,324,653.61	-	84,236.16	DESCALIFICADO	\$ 21,815,747.06	DESCALIFICADO	
3	A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V.	-	1,915,729.00	-	-	-	56,357.37	-	9,835.98	-	1,921,122.35	-	1,712,293.63	-	209,080.70	DESCALIFICADO	\$ 21,857,436.63	DESCALIFICADO	
4	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE BOMBEO, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	283,044.94	-	1,715,592.55	-	87,767.60	-	32,232.83	-	2,160,637.94	-	89,854.91	DESCALIFICADO	\$ 22,865,119.68	DESCALIFICADO	
5	URBAMENTAL, S.A. DE C.V.	-	-	-	256,100.90	-	1,715,554.82	-	-	-	32,199.28	-	2,053,844.98	-	44,605.55	SOLVENTE	\$ 23,084,678.46	GANADOR	
6	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	953,949.26	-	-	-	157,332.28	-	-	-	1,111,281.56	-	2,473,441.69	-	1,362,180.12	SOLVENTE	\$ 23,129,340.60	SOLVENTE	
7	NACZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	324,061.15	-	164,273.66	-	-	299,430.34	-	17,641.99	-	795,607.54	-	1,921,071.56	-	1,494,264.22	SOLVENTE	\$ 23,157,492.25	SOLVENTE
8	VALUTEX GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	-	520,533.40	-	234,229.33	-	-	-	5,409.34	-	761,069.07	-	2,235,562.70	-	1,474,476.63	SOLVENTE	\$ 23,164,274.19	SOLVENTE	
9	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	-	254,500.54	-	211,316.29	-	-	106,231.54	-	-	594,059.41	-	1,294,670.39	-	1,700,753.98	SOLVENTE	\$ 23,180,016.98	SOLVENTE	
10	BUOJAL S.A. DE C.V.	-	-	-	454,239.06	-	14,967.63	-	-	-	553,709.78	-	1,912,735.93	-	1,359,026.17	SOLVENTE	\$ 23,241,109.10	SOLVENTE	
11	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	-	285,330.35	-	247,817.03	-	-	182,356.43	-	-	816,493.81	-	2,377,650.40	-	1,759,156.60	SOLVENTE	\$ 23,269,148.41	SOLVENTE	
12	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	-	674,386.32	-	-	-	180,145.85	-	-	-	1,004,513.97	-	1,994,829.20	-	992,469.22	SOLVENTE	\$ 23,307,459.42	SOLVENTE	
13	SM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	196,221.26	-	106,311.64	-	-	228,966.13	-	27,857.27	-	561,356.30	-	2,115,509.45	-	1,554,153.16	SOLVENTE	\$ 23,342,341.86	SOLVENTE
14	ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	-	283,470.96	-	83,765.13	-	-	170,103.91	-	31,502.16	-	568,642.18	-	1,134,895.96	-	1,564,055.80	SOLVENTE	\$ 23,502,214.81	SOLVENTE
15	PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	-	167,697.11	-	136,499.72	-	-	-	-	30,013.73	-	334,210.56	-	1,945,029.29	-	1,610,617.74	SOLVENTE	\$ 23,623,116.26	SOLVENTE
16	KALEZA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	-	166,872.64	-	136,499.72	-	-	-	29,796.31	-	332,961.71	-	2,048,879.89	-	1,715,911.18	SOLVENTE	\$ 23,799,252.96	SOLVENTE	
17	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	-	-	-	893,313.45	-	-	53,316.53	-	17,295.56	-	963,923.54	-	2,147,496.89	-	1,183,571.35	SOLVENTE	\$ 24,229,088.89	SOLVENTE
18	DORMANT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	1,807,335.76	-	-	-	1,607,335.76	-	1,985,131.56	-	157,795.60	SOLVENTE	\$ 24,363,160.93	SOLVENTE	
19	DINAMIO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	-	1,635,372.06	-	-	-	-	-	1,635,372.06	-	1,302,129.71	-	372,751.68	SOLVENTE	\$ 24,431,128.40	SOLVENTE	
20	EDIFICACIONES Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V.	-	466,697.92	-	-	-	-	-	26,376.13	-	493,266.05	-	2,152,214.69	-	1,845,046.53	SOLVENTE	\$ 29,030,319.83	DESCALIFICADO	
21	RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.	-	-	-	1,241,154.66	-	-	-	-	-	1,241,154.66	-	1,726,842.11	-	899,297.43	SOLVENTE	\$ 29,030,319.83	DESCALIFICADO	
22	CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 29,030,319.83	DESCALIFICADO		

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número "DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023" al licitante "URBAMENTAL, S.A. DE C.V.", el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$23'084,678.46 (Veintidós millones ochenta y cuatro mil seiscientos setenta y ocho pesos 46/100 m.n.) más \$3'693,548.55 (Tres millones seiscientos noventa y tres mil quinientos cuarenta y ocho pesos 55/100 m.n.), de I.V.A. para un monto total de \$26'778,227.01 (Veintiséis millones setecientos setenta y ocho mil doscientos veintisiete pesos 01/100 m.n.).



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la **Licitación Pública**, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y **teniendo que presentó la propuesta solvente más baja**.

Dado lo anterior, el adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de **Anticipo** o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de **Cumplimiento**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Póliza de Seguro, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido Positivo, actualizado y vigente.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad social, en Positivo, actualizado y vigente.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito de los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

Esta documentación **se deberá de entregar previo a la firma del Contrato**; estableciéndose como **fecha para suscribirlo el día jueves 11 de mayo de 2023, a las 10:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si en la fecha señalada el adjudicatario NO firma el contrato por causas imputables a él mismo**, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado, y se procederá a realizar nueva licitación.

De igual manera se establece que, **si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato**, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra** o servicio; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, **el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023
FALLO



Deberán iniciarse los trabajos el día 15 de mayo de 2023 y concluirse el día 31 de agosto de 2023, período de 109 días naturales, conforme se estableció en la Convocatoria.


Emite el presente fallo **Sandra Patricia Sánchez Valdez, Jefe de Unidad de Presupuesto y Contratación de Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco.

La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **02 de mayo de 2023**, en cumplimiento a lo dispuesto por artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO


OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS


ENRIQUE BARAJAS NOVOA
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN


SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
